

LAPORAN PENGAWASAN



PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/ KANTOR

LOKASI:

KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

SUMBER DANA:

**DANA ALOKASI UMUM (DAU) KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



CV. ANGGAR LAKSITA

Engineering Consultant & Supervisi

Alamat: Jetis RT 04 RW 01, Pule, Selogiri, Wonogiri.

LAPORAN PENGAWASAN



PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/ KANTOR

LOKASI:

KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

SUMBER DANA:

**DANA ALOKASI UMUM (DAU) KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



CV. ANGGAR LAKSITA

Engineering Consultant & Supervisi

Alamat: Jetis RT 04 RW 01, Pule, Selogiri, Wonogiri.

LAPORAN BULANAN



PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/ KANTOR

LOKASI:


KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

SUMBER DANA:

**DANA ALOKASI UMUM (DAU) KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



CV. ANGGAR LAKSITA
Engineering Consultant & Supervisi
Alamat: Jetis RT 04 RW 01, Pule, Selogiri, Wonogiri.



REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
BULAN : MARET
PERIODE : 18 s/d 31 Maret 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	44,12	1,092
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	91,74	1,639
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	58,95	11,326
III	PEKERJAAN BETON	14,515	67,47	9,793
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	0,00	0,000
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	56,06	1,122
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	23,76	6,503
III	PEKERJAAN BETON	14,414	7,93	1,143
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	0,00	0,000
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	32,618
REALISASI PEKERJAAN		32,618	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		1,826	%	
DEVIASI		30,792	%	MENDAHULUI

Mengetahui :
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar

FERIANA DWI KURNIAWATI, S.P., M.Si.
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 31 Maret 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEKERJAAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DATA : DATA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/100/PPK/01/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.750.447,49
TGL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL. KONTRAK ADD :
BULAN : MARET
Tanggal : 18 s/d 31 Maret 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MC 0		Bobot	%	BULAN LALU			BULAN INI		S/D BULAN INI			Keterangan
		VOLUME	SAT.			Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m ²	0,747	%	-	-	-	25,00	0,747	25,00	0,747	100,00	- Bulan lalu : 0,000
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%	-	-	-	0,20	0,059	0,20	0,059	20,00	
3	Penyelenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%	-	-	-	0,20	0,287	0,20	0,287	20,00	- Bulan ini : 32,618
				2,476	%					1,092		1,092		
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG													- s/d Bulan ini : 32,618
I	PEKERJAAN TANAH													
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	-	-	-	38,03	1,227	38,03	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengurangan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	-	-	-	6,34	0,148	6,34	0,148	50,00	- Bulan ini : 1,826
3	Pengurangan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	-	-	-	2,81	0,264	2,81	0,264	100,00	
				1,786	%					1,639		1,639		- Percepatan/ : 30,792
II	PEKERJAAN PASANGAN													
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	-	-	-	22,95	6,166	22,95	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	-	-	-	85,22	4,098	85,22	4,098	95,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	-	-	-	44,85	0,852	44,85	0,852	25,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	225,50	m ²	1,898	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,86	m2	0,600	%	-	-	-	9,40	0,210	9,40	0,210	35,00	
				19,211	%					11,326		11,326		
III	PEKERJAAN BETON													
a.	FOOT PLAT													
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	-	-	-	0,26	0,098	0,26	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	-	-	-	0,79	0,327	0,79	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	-	-	-	67,29	0,387	67,29	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakal)	6,30	m2	0,325	%	-	-	-	6,30	0,325	6,30	0,325	100,00	
b.	SLOOF 15x20													
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	-	-	-	2,19	0,907	2,19	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	-	-	-	258,58	1,489	258,58	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	29,14	m2	1,545	%	-	-	-	29,14	1,545	29,14	1,545	100,00	
c.	KOLOM 15x25													
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	-	-	-	2,41	1,000	2,41	1,000	90,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	-	-	-	267,51	1,540	267,51	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	35,70	m2	2,417	%	-	-	-	32,13	2,175	32,13	2,175	90,00	
d.	RING BALOK 15x20													
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	29,14	m2	1,973	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				14,516	%					9,793		9,793		
IV	PEKERJAAN CAT													
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5,691	%									
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING													
I	PEKERJAAN TANAH													
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	-	-	-	27,34	0,882	27,34	0,882	95,00	
2	Pengurangan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengurangan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	-	-	-	2,55	0,240	2,55	0,240	95,00	
				2,001	%					1,122		1,122		
II	PEKERJAAN PASANGAN													
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	-	-	-	21,04	5,653	21,04	5,653	95,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	-	-	-	17,68	0,850	17,68	0,850	15,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	174,86	m ²	1,472	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang batu andesi	43,61	m2	5,026	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				27,368	%					6,503		6,503		
III	PEKERJAAN BETON													
	BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	-	-	-	0,17	0,069	0,17	0,069	15,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	-	-	-	43,20	0,249	43,20	0,249	15,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	18,43	m2	1,248	%	-	-	-	2,76	0,187	2,76	0,187	15,00	
	BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	-	-	-	0,36	0,150	0,36	0,150	15,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	-	-	-	47,74	0,275	47,74	0,275	15,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	26,83	m2	1,422	%	-	-	-	4,02	0,213	4,02	0,213	15,00	
	BETON LAITE 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	26,83	m2	1,816	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	24,59	m2	1,304	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				14,414	%					1,143		1,143		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN													
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless *DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAR	765,00	cm	1,610	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m ²	3,390	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				12,640	%									
	JUMLAH PROSENTASE S/D BULAN INI					-	-	-		32,618		32,618		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA												1,826	
	DEVIASI												30,792	Mendahulul

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKGAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 31 Maret 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
BULAN : APRIL
PERIODE : 1 s/d 28 April 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	65,08	1,611
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	100,00	1,786
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	90,99	17,480
III	PEKERJAAN BETON	14,515	100,00	14,515
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	0,00	0,000
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	64,59	1,292
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	55,08	15,072
III	PEKERJAAN BETON	14,414	100,00	14,414
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	0,00	0,000
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	66,171
REALISASI PEKERJAAN		66,171	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		61,628	%	
DEVIASI		4,543	%	MENDAHULUI

Mengetahui :
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar


FERIANA DWI KURNIAWATI, S.P., M.Si.
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI


MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 28 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA


ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/DALAM KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. BPK : 027/160/PPK/0/2024
NILAI KONTRAK : Rp253.760.447,49
TGL. KONTRAK : 15 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL. KONTRAK ADD :
BULAN : APRIL
Tanggal : 1 s/d 28 April 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MCU		Bobot	%	BULAN LALU			BULAN INI		S/D BULAN INI			Keterangan
		VOLUME	SAT.			Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bonaplank	25,00	m	0,747	%	25,00	0,747	100,00	-	-	25,000	0,747	100,00	- Bulan lalu : 32,618
2	Pembersihan lapangan	1,00	ts	0,294	%	0,20	0,059	20,00	0,30	0,088	0,500	0,147	50,00	- Bulan ini : 33,553
3	Penyelenggaraan K3	1,00	ts	1,435	%	0,20	0,267	20,00	0,30	0,431	0,500	0,718	50,00	- s/d Bulan ini : 66,171
				2,476	%		1,092			0,519		1,611		
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG													
I	PEKERJAAN TANAH													
1	Pengurutan 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	38,03	1,227	100,00	-	-	38,033	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengurutan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	6,34	0,148	50,00	6,34	0,148	12,678	0,295	100,00	- Bulan ini : 61,628
3	Pengurutan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	2,81	0,264	100,00	-	-	2,812	0,264	100,00	- Percepatan/ : 4,543
				1,786	%		1,639			0,148		1,786		
II	PEKERJAAN PASANGAN													
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	22,95	6,166	100,00	-	-	22,948	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	85,22	4,098	95,00	4,49	2,216	89,700	4,313	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	44,85	0,852	25,00	125,58	2,388	170,430	3,238	95,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	-	-	-	134,55	2,119	134,550	2,119	75,00	
5	Sponengan	225,50	m	1,898	%	-	-	-	124,03	1,044	124,025	1,044	55,00	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,86	m2	0,600	%	9,40	0,210	35,00	17,46	0,390	26,860	0,600	100,00	
				19,211	%		11,326			6,154		17,480		
III	PEKERJAAN BETON													
a. FOOT PLAT														
1	Membuat lantai kerja beton mutu fc = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,26	0,098	100,00	-	-	0,263	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,79	0,327	100,00	-	-	0,788	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	67,29	0,387	100,00	-	-	67,292	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakai)	6,30	m2	0,325	%	6,30	0,325	100,00	-	-	6,300	0,325	100,00	
b. SLOOF 15x20														
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19	0,907	100,00	-	-	2,186	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58	1,489	100,00	-	-	258,578	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	29,14	m2	1,545	%	29,14	1,545	100,00	-	-	29,140	1,545	100,00	
c. KOLOM 15x25														
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	2,41	1,000	99,00	0,27	0,111	2,678	1,111	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	267,51	1,540	100,00	-	-	267,511	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	35,70	m2	2,417	%	32,13	2,175	99,00	3,57	0,242	35,700	2,417	100,00	
d. RING BALOK 15x20														
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	-	-	-	2,19	0,907	2,186	0,907	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	-	-	-	258,58	1,489	258,578	1,489	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	29,14	m2	1,973	%	-	-	-	29,14	1,973	29,140	1,973	100,00	
				14,515	%		9,793			4,722		14,515		
IV	PEKERJAAN CAT													
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,790	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Ringkai (cat hollow)	8,00	m2	0,842	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5,591	%									
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING													
I	PEKERJAAN TANAH													
1	Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	27,34	0,882	95,00	1,44	0,046	28,784	0,928	100,00	
2	Pengurutan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	-	-	-	4,80	0,112	4,797	0,112	50,00	
3	Urug tanah padat (Tanah Galian)	8,91	m3	0,597	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengurutan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	2,55	0,240	95,00	0,13	0,013	2,684	0,252	100,00	
				2,001	%		1,122			0,171		1,292		
II	PEKERJAAN PASANGAN													
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	21,04	5,653	95,00	1,11	0,298	22,146	5,950	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	17,68	0,850	15,00	100,19	4,818	117,874	5,668	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	-	-	-	144,31	2,742	144,313	2,742	85,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%	-	-	-	19,88	0,313	19,884	0,313	10,00	
5	Sponengan	174,86	m	1,472	%	-	-	-	17,49	0,147	17,486	0,147	10,00	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	-	-	-	2,18	0,251	2,181	0,251	5,00	
7	Pasang batu lempeng tsik beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				27,366	%		5,503			8,569		15,072		
III	PEKERJAAN BETON													
BETON KOLOM 15x15														
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	0,17	0,069	15,00	0,94	0,390	1,106	0,459	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	43,20	0,249	15,00	244,80	1,410	287,995	1,658	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	18,43	m2	1,248	%	2,76	0,187	15,00	15,67	1,061	18,432	1,248	100,00	
BETON SLOOF 15x15														
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	0,36	0,150	15,00	2,05	0,852	2,416	1,003	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	47,74	0,275	15,00	270,50	1,558	318,238	1,833	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	26,83	m2	1,422	%	4,02	0,213	15,00	22,80	1,209	26,826	1,422	100,00	
BETON LATEI 15x15														
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	-	-	-	2,07	0,859	2,071	0,859	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	-	-	-	312,99	1,802	312,987	1,802	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	26,83	m2	1,816	%	-	-	-	26,83	1,816	26,826	1,816	100,00	
PLAT														
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	-	-	-	0,78	0,325	0,782	0,325	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	-	-	-	119,02	0,685	119,022	0,685	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	24,59	m2	1,304	%	-	-	-	24,59	1,304	24,591	1,304	100,00	
				14,414	%		1,143			13,271		14,414		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN													
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Coatng Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAR"	765,00	cm	1,610	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tahan 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpenbagi (2x1,5mm)	150,00	m	3,390	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ts	2,104	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				12,540	%									
	JUMLAH PROSENTASE S/D BULAN INI						32,618			33,553		66,171		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%								61,628	
	DEVIASI												4,543	Mondahului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 28 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
BULAN : MEI
PERIODE : 29 April s/d 17 Mei 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	90,93	2,252
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	91,49	1,634
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	123,41	23,708
III	PEKERJAAN BETON	14,515	88,20	12,802
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	95,84	5,359
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	88,11	1,763
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	94,86	25,959
III	PEKERJAAN BETON	14,414	113,29	16,330
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	80,65	10,194
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	100,000
REALISASI PEKERJAAN		100,000	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		92,772	%	
DEVIASI		7,228	%	MENDAHULUI


Mengetahui :
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar


FERIANA DWI KURNIAWATI, S.P., M.Si.
NIP. 19810226 200501 2 015

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI


MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 17 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA


ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TUNJUKAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/160/PPK/01/2024
NILAI KONTRAK : Rp253.750.447,49
TGL KONTRAK : 18 Mei 2024
NILAI ADD : 027/228/PPK/01/2024
NILAI ADENDUM : Rp200.050.916,00
TGL KONTRAK ADD : 08 Mei 2024
BULAN MEI
Tanggal : 29 April s.d 17 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	MC 100		Bobot	%	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			Keterangan
		VOLUME	SAT.			Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	Volume	Bobot (%)	Prosentase (%)	
A PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m ²	0,679	%	25,00	0,679	100,00	-	-	25,00	0,679	100,00	PRESTASI PEKERJAAN : - Minggu lalu : 0,000	
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,268	%	0,50	0,134	50,00	0,50	0,134	1,00	0,268	100,00		
3	Penyelenggaraan K3	1,00	ls	1,305	%	0,50	0,652	50,00	0,50	0,652	1,00	1,305	100,00	- Minggu ini : 100,000	
				2,252	%		1,47			0,786		2,252			
B PEKERJAAN PAGAR BELAKANG															
I PEKERJAAN TANAH															
1	Penggiliran 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,28	m3	1,123	%	38,03	1,115	99,36	0,25	0,007	38,28	1,123	100,00	- Rencana	
2	Pengurungan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,76	m3	0,270	%	12,68	0,268	99,36	0,08	0,002	12,76	0,270	100,00	- Minggu ini : 92,772	
3	Pengurungan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,82	m3	0,241	%	2,81	0,240	99,57	0,01	0,001	2,82	0,241	100,00		
				1,634	%		1,62			0,010		1,634		- Percepatan/ : 7,228	
II PEKERJAAN PASANGAN															
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,94	m3	5,606	%	22,94	5,606	100,00	-	-	22,94	5,606	100,00		
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	111,33	m2	4,868	%	89,70	3,922	80,57	21,63	0,946	111,33	4,868	100,00		
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	316,24	m2	5,463	%	170,43	2,944	53,89	145,81	2,519	316,24	5,463	100,00		
4	Pemasangan 1 m2 Acian	316,24	m2	4,528	%	134,55	1,927	42,55	181,69	2,602	316,24	4,528	100,00		
5	Sponengan	225,50	m ²	1,726	%	124,03	0,949	55,00	101,48	0,777	225,50	1,726	100,00		
6	Sponengan	165,62	m ²	0,951	%	-	-	-	165,62	0,951	165,62	0,951	100,00		
7	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	27,83	m2	0,566	%	26,86	0,546	96,51	0,97	0,020	27,83	0,566	100,00		
				23,708	%		16,89	67,04		7,813		23,708			
III PEKERJAAN BETON															
a. FOOT PLAT															
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,28	m3	0,093	%	0,26	0,089	95,45	0,01	0,004	0,28	0,093	100,00		
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	0,83	m3	0,311	%	0,79	0,297	95,45	0,04	0,014	0,83	0,311	100,00		
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	65,39	kg	0,342	%	65,39	0,342	100,00	-	-	65,39	0,342	100,00		
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakal)	6,60	m2	0,309	%	6,30	0,295	95,45	0,30	0,014	6,60	0,309	100,00		
b. SLOOF 15x20															
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,788	%	2,09	0,788	100,00	-	-	2,09	0,788	100,00		
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	228,76	kg	1,198	%	228,76	1,198	100,00	-	-	228,76	1,198	100,00		
7	Memasang bekisting untuk sloot (3x pakal)	27,83	m2	1,342	%	27,83	1,342	100,00	-	-	27,83	1,342	100,00		
c. KOLOM 15x25															
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	2,81	m3	1,058	%	2,68	1,010	95,45	0,13	0,048	2,81	1,058	100,00		
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	259,54	kg	1,359	%	259,54	1,359	100,00	-	-	259,54	1,359	100,00		
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	37,40	m2	2,303	%	35,70	2,198	95,45	1,70	0,105	37,40	2,303	100,00		
d. RING BALOK 15x20															
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,788	%	2,09	0,788	100,00	-	-	2,09	0,788	100,00		
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	228,76	kg	1,198	%	228,76	1,198	100,00	-	-	228,76	1,198	100,00		
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	27,83	m2	1,714	%	27,83	1,714	100,00	-	-	27,83	1,714	100,00		
				12,802	%		12,62	98,55		0,185		12,802			
IV PEKERJAAN CAT															
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	371,90	m2	4,593	%	-	-	-	371,90	4,593	371,90	4,593	100,00		
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,765	%	-	-	-	8,00	0,765	8,00	0,765	100,00		
				5,359	%		-	-		5,359		5,359			
C PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING															
I PEKERJAAN TANAH															
1	Penggiliran 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,52	m3	0,836	%	28,52	0,836	100,00	-	-	28,52	0,836	100,00		
2	Pengurungan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,51	m3	0,201	%	9,51	0,201	100,00	-	-	9,51	0,201	100,00		
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	7,91	m3	0,481	%	-	-	-	7,91	0,481	7,91	0,481	100,00		
4	Pengurungan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,85	m3	0,244	%	2,68	0,229	94,12	0,17	0,014	2,85	0,244	100,00		
				1,763	%		1,27	71,88		0,495		1,763			
II PEKERJAAN PASANGAN															
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	25,16	m3	6,147	%	22,15	5,411	88,02	3,01	0,736	25,16	6,147	100,00		
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	112,72	m2	4,929	%	112,72	4,929	100,00	-	-	112,72	4,929	100,00		
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	129,55	m2	2,238	%	126,96	2,193	98,00	2,59	0,045	129,55	2,238	100,00		
4	Pemasangan 1 m2 Acian	157,40	m2	2,254	%	19,88	0,285	12,63	137,51	1,969	157,40	2,254	100,00		
5	Sponengan	174,86	m ²	1,338	%	17,49	0,134	10,00	157,37	1,205	174,86	1,338	100,00		
6	Sponengan	160,26	m ²	0,920	%	-	-	-	160,26	0,920	160,26	0,920	100,00		
7	Pasang batu andesit	48,82	m2	5,115	%	2,18	0,228	4,47	46,64	4,887	48,82	5,115	100,00		
8	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,631	%	-	-	-	22,36	2,631	22,36	2,631	100,00		
9	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	3,93	m2	0,386	%	-	-	-	3,93	0,386	3,93	0,386	100,00		
				26,959	%		13,18			12,779		26,959			
III PEKERJAAN BETON															
BETON KOLOM 15x15															
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,417	%	1,11	0,417	100,00	-	-	1,11	0,417	100,00		
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	266,85	kg	1,397	%	266,85	1,397	100,00	-	-	266,85	1,397	100,00		
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	18,43	m2	1,135	%	18,43	1,135	100,00	-	-	18,43	1,135	100,00		
BETON SLOOF 15x15															
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	2,35	m3	0,886	%	2,35	0,886	100,00	-	-	2,35	0,886	100,00		
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	282,84	kg	1,481	%	282,84	1,481	100,00	-	-	282,84	1,481	100,00		
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	25,70	m2	1,239	%	25,70	1,239	100,00	-	-	25,70	1,239	100,00		
BETON LATEI 15x15															
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,787	%	2,07	0,781	99,27	0,02	0,006	2,09	0,787	100,00		
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	279,21	kg	1,462	%	279,21	1,462	100,00	-	-	279,21	1,462	100,00		
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	25,70	m2	1,583	%	25,70	1,583	100,00	-	-	25,70	1,583	100,00		
PLAT															
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	0,75	m3	0,283	%	0,75	0,283	100,00	-	-	0,75	0,283	100,00		
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	105,29	kg	0,551	%	105,29	0,551	100,00	-	-	105,29	0,551	100,00		
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	23,56	m2	1,136	%	23,56	1,136	100,00	-	-	23,56	1,136	100,00		
PLAT RAM PINTU MASUK DAN KELUAR															
13	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' =14,5 Mpa (K175)	6,60	m3	2,490	%	-	-	-	6,60	2,490	6,60	2,490	100,00		
14	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	240,31	kg	1,258	%	-	-	-	240,31	1,258	240,31	1,258	100,00		
15	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	4,64	m2	0,224	%	-	-	-	4,64	0,224	4,64	0,224	100,00		
				16,330	%		12,362	75,64		3,978		16,330			
IV PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN															
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	157,40	m2	1,944	%	-	-	-	157,40	1,944	157,40	1,944	100,00		
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,515	%	-	-	-	65,97	1,515	65,97	1,515	100,00		
3	Coating Batu alam	9,14	m2	0,122	%	-	-	-	9,14	0,122	9,14	0,122	100,00		
4	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAR	765,00	cm	1,464	%	-	-	-	765,00	1,464	765,00	1,464	100,00		
5	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,046	%	-	-	-	0,80	0,046	0,80	0,046	100,00		
6	Instalasi kabel pembagi (2x1,5mm)	150,00	m ²	3,083	%	-	-	-	150,00	3,083	150,00	3,083	100,00		
7	Memasang lampu LED 5 watt	19,00	bh	0,936	%	-	-	-	19,00	0,936	19,00	0,936	100,00		
8	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,031	%	-	-	-	1,00	0,031	1,00	0,031	100,00		
9	Membuat Pintu Portal Besi pipa	-	ls	-	%	-	-	-	-	-	-	-			
10	Pintu Pagar Depan Rangka Hollow	11,00	m2	1,052	%	-	-	-	11,00	1,052	11,00	1,052	100,00		
				10,194	%		-			10,194		10,194			
	JUMLAH PROSENTASE S/D BULAN INI						68,400			41,600		100,000			
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%								92,772		
	DEVIASI												7,228	Mendahului	

LAPORAN MINGGUAN



PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/ KANTOR

LOKASI:


KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

SUMBER DANA:

**DANA ALOKASI UMUM (DAU) KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



CV. ANGGAR LAKSITA
Engineering Consultant & Supervisi
Alamat: Jetis RT 04 RW 01, Pule, Selogiri, Wonogiri.



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 1 (SATU)
PERIODE : 18 s/d 24 Maret 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	16,63	0,412
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	22,89	0,409
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	1,60	0,308
III	PEKERJAAN BETON	14,515	1,45	0,211
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	-	-
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	-	-
III	PEKERJAAN BETON	14,414	-	-
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	1,340
REALISASI PEKERJAAN		1,340	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		0,680	%	
DEVIASI		0,660	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI



MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 24 Maret 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA



ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI KANTOR
L O K A S I : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/160/PPK/II/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.750.447,49
TGL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL. KONTRAK ADD :
Minggu ke : 1 (SATU)
Tanggal : 18 s/d 24 Maret 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MCO		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyel. sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m	0,747	%		8,00	8,00		0,239	0,239	32,00	- Minggu lalu : 0,000
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%		0,10	0,10		0,029	0,029	10,00	
3	Penyelenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%		0,10	0,10		0,144	0,144	10,00	- Minggu ini : 1,340
				2,476	%						0,412		
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG												- s/d Minggu ini : 1,340
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%		12,68	12,68		0,409	0,409	33,33	- Rencana
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%		-	-		-	-	-	- Minggu ini : 0,680
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%		-	-		-	-	-	
				1,786	%						0,409		- Percepatan/ : 0,660
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%		1,15	1,15		0,308	0,308	5,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%		-	-		-	-	-	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%		-	-		-	-	-	
4	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	2,825	%		-	-		-	-	-	
5	Sponengan	225,50	m	1,898	%		-	-		-	-	-	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,88	m2	0,600	%		-	-		-	-	-	
				19,211	%						0,308		
III	PEKERJAAN BETON												
a.	FOOT PLAT												
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%		0,01	0,01		0,005	0,005	5,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%		0,04	0,04		0,016	0,016	5,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%		3,36	3,36		0,019	0,019	5,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakal)	6,30	m2	0,325	%		0,32	0,32		0,016	0,016	5,00	
b.	SLOOF 15x20												
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%		-	-		-	-	-	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%		-	-		-	-	-	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	29,14	m2	1,545	%		-	-		-	-	-	
c.	KOLOM 15x25												
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%		-	-		-	-	-	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%		26,75	26,75		0,154	0,154	10,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	35,70	m2	2,417	%		-	-		-	-	-	
d.	RING BALOK 15x20												
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%		-	-		-	-	-	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%		-	-		-	-	-	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	29,14	m2	1,973	%		-	-		-	-	-	
				14,515	%						0,211		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%		-	-		-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%		-	-		-	-	-	
				5,591	%								
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%		-	-		-	-	-	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%		-	-		-	-	-	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%		-	-		-	-	-	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%		-	-		-	-	-	
				2,001	%								
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%		-	-		-	-	-	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,688	%		-	-		-	-	-	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%		-	-		-	-	-	
4	Memasang plesteran 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%		-	-		-	-	-	
5	Sponengan	174,86	m	1,472	%		-	-		-	-	-	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%		-	-		-	-	-	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,693	%		-	-		-	-	-	
				27,366	%								
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%		-	-		-	-	-	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%		-	-		-	-	-	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	18,43	m2	1,248	%		-	-		-	-	-	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%		-	-		-	-	-	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%		-	-		-	-	-	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	26,83	m2	1,422	%		-	-		-	-	-	
BETON LATEI 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%		-	-		-	-	-	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%		-	-		-	-	-	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	26,83	m2	1,816	%		-	-		-	-	-	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%		-	-		-	-	-	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%		-	-		-	-	-	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	24,59	m2	1,304	%		-	-		-	-	-	
				14,414	%								
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%		-	-		-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%		-	-		-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARA	765,00	cm	1,610	%		-	-		-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%		-	-		-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m	3,390	%		-	-		-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%		-	-		-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%		-	-		-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%		-	-		-	-	-	
				12,640	%								
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI								-	1,340	1,340		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA				100,00	%					0,680		
	DEVIASI										0,660		Mendatului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 24 Maret 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 2 (DUA)
PERIODE : 25 s/d 31 Maret 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	44,12	1,092
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	91,74	1,639
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	58,95	11,326
III	PEKERJAAN BETON	14,515	67,47	9,793
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	56,06	1,122
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	23,76	6,503
III	PEKERJAAN BETON	14,414	7,93	1,143
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	32,618
REALISASI PEKERJAAN		32,618	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		1,826	%	
DEVIASI		30,792	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 31 Maret 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA


ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
L O K A S I : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024


KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/160/PPK/II/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.750.447,49
TGL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL. KONTRAK ADD :
Minggu ke : 2 (DUA)
Tanggal : 25 s/d 31 Maret 2024

No.	Uraian Pekerjaan	MCO		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyel. sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m ²	0,747	%	8,00	17,00	25,00	0,239	0,508	0,747	100,00	- Minggu lalu : 1,340
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%	0,10	0,10	0,20	0,029	0,029	0,059	20,00	
3	Penyenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%	0,10	0,10	0,20	0,144	0,144	0,287	20,00	- Minggu ini : 31,278
				2,476	%				0,412		1,092		
B	PEKERJAAN PAGAR DELAKANG												- s/d Minggu ini : 32,618
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	12,68	25,36	38,03	0,409	0,818	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	-	6,34	6,34	-	0,148	0,148	50,00	- Minggu ini : 1,826
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	-	2,81	2,81	-	0,264	0,264	100,00	
				1,786	%				0,409		1,639		- Percepatan/ : 30,792
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	1,15	21,80	22,95	0,308	5,857	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	-	85,22	85,22	-	4,098	4,098	95,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	-	44,85	44,85	-	0,852	0,852	25,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	225,50	m ²	1,898	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang dinding lerawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,86	m2	0,600	%	-	9,40	9,40	-	0,210	0,210	35,00	
				19,211	%				0,308		11,326		
III	PEKERJAAN BETON												
a.	FOOT PLAT												
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-5) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,01	0,25	0,26	0,005	0,093	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,04	0,75	0,79	0,016	0,310	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	3,36	63,93	67,29	0,019	0,368	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakal)	6,30	m2	0,325	%	0,32	5,99	6,30	0,016	0,308	0,325	100,00	
b.	SLOOF 15x20												
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	-	2,19	2,19	-	0,907	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	-	258,58	258,58	-	1,489	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	29,14	m2	1,545	%	-	29,14	29,14	-	1,545	1,545	100,00	
c.	KOLOM 15x25												
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	-	2,41	2,41	-	1,000	1,000	90,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	26,75	240,76	267,51	0,154	1,386	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	35,70	m2	2,417	%	-	32,13	32,13	-	2,175	2,175	90,00	
d.	RING BALOK 15x20												
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	-	-	-	-	-	-	-	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	-	-	-	-	-	-	-	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	29,14	m2	1,973	%	-	-	-	-	-	-	-	
				14,516	%				0,211		9,793		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%	-	-	-	-	-	-	-	
				5,591	%				-	-	-	-	
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	-	27,34	27,34	-	0,882	0,882	95,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	-	-	-	-	-	-	-	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	-	2,55	2,55	-	0,240	0,240	95,00	
				2,001	%				-		1,122		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	-	21,04	21,04	-	5,653	5,653	95,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	-	17,68	17,68	-	0,850	0,850	15,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	174,86	m ²	1,472	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang batu tempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%	-	-	-	-	-	-	-	
				27,366	%				-		6,503		
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	-	0,17	0,17	-	0,069	0,069	15,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	-	43,20	43,20	-	0,249	0,249	15,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	18,43	m2	1,248	%	-	2,76	2,76	-	0,187	0,187	15,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	-	0,36	0,36	-	0,150	0,150	15,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	-	47,74	47,74	-	0,275	0,275	15,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	26,83	m2	1,422	%	-	4,02	4,02	-	0,213	0,213	15,00	
BETON LAJE 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	-	-	-	-	-	-	-	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	26,83	m2	1,816	%	-	-	-	-	-	-	-	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	-	-	-	-	-	-	-	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	24,59	m2	1,304	%	-	-	-	-	-	-	-	
				14,414	%				-		1,143		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-	-	-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARA	765,00	cm	1,610	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m ²	3,390	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%	-	-	-	-	-	-	-	
				12,540	%				1,34	31,278	32,618		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI												
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%							1,826	
	DEVIASI											30,792	Mendahului

Mengetahui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 31 Maret 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 3 (TIGA)
PERIODE : 1 s/d 7 April 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	51,11	1,265
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	100,00	1,786
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	64,77	12,443
III	PEKERJAAN BETON	14,515	100,00	14,515
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	64,59	1,292
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	42,46	11,619
III	PEKERJAAN BETON	14,414	100,00	14,414
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	57,334
REALISASI PEKERJAAN		57,334	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		11,035	%	
DEVIASI		46,299	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI



MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 7 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA



ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEKERJAAN PAGAR GEDUNG/ BALAU KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DATA : DATA ALOKASI UMUM
TAKSIRAN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/60/PPK/10/2024
JILAI KONTRAK : Rp253.750.447,48
TEL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
KULAI ADERUM :
TEL. KONTRAK ADD :
Minggu ke : 3 (TGA)
Tanggal : 1 s/d 7 April 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MC 0		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyel.	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)	sampai minggu ini (%)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN : - Minggu lalu : 32,618 - Minggu ini : 24,716 - s/d Minggu ini : 67,334
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m'	0,747	%	25,00	-	25,00	0,747	-	0,747	100,00	
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%	0,20	0,10	0,30	0,059	0,029	0,088	30,00	
3	Penyenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%	0,20	0,10	0,30	0,287	0,144	0,431	30,00	
				2,476	%				1,092		1,265		
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG												- s/d Minggu ini : 67,334
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	38,03		38,03	1,227	-	1,227	100,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	6,34	6,34	12,68	0,148	0,295	0,443	100,00	
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	2,81		2,81	0,264	-	0,264	100,00	- Percepatan/ : 46,299
				1,786	%				1,639		1,786		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	22,95		22,95	6,166	-	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	85,22	4,49	89,70	4,098	0,216	4,313	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	44,85	26,91	71,76	0,852	0,511	1,363	40,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	225,50	m'	1,898	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,66	m2	0,600	%	9,40	17,46	26,86	0,210	0,390	0,600	100,00	
				19,211	%				11,326		12,443		
III	PEKERJAAN BETON												
a.	FOOT PLAT												
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,26		0,26	0,098	-	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,79		0,79	0,327	-	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	67,29		67,29	0,387	-	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakai)	6,30	m2	0,325	%	6,30		6,30	0,325	-	0,325	100,00	
b.	SLOOF 15x20												
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	29,14	m2	1,545	%	29,14		29,14	1,545	-	1,545	100,00	
c.	KOLOM 15x25												
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	2,41	0,27	2,68	1,000	0,111	1,111	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	267,51		267,51	1,540	-	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	35,70	m2	2,417	%	32,13	3,57	35,70	2,175	0,242	2,417	100,00	
d.	RING BALOK 15x20												
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	-	2,19	2,19	-	0,907	0,907	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	-	258,58	258,58	-	1,489	1,489	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	29,14	m2	1,973	%	-	29,14	29,14	-	1,973	1,973	100,00	
				14,515	%				9,793		14,515		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%	-	-	-	-	-	-	-	
				5,591	%				-	-	-	-	
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	27,34	1,44	28,78	0,882	0,046	0,928	100,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	-	4,80	4,80	-	0,112	0,112	50,00	
3	Urug tanah padat (tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	2,55	0,13	2,68	0,240	0,013	0,252	100,00	
				2,001	%				1,122		1,292		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	21,04	1,11	22,15	5,653	0,298	5,950	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	17,68	100,19	117,87	0,850	4,818	5,668	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	169,84	m2	3,131	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	174,86	m'	1,472	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%	-	-	-	-	-	-	-	
				27,386	%				6,503		11,519		
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLON 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	0,17	0,94	1,11	0,069	0,390	0,459	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	43,20	244,80	287,99	0,249	1,410	1,658	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	18,43	m2	1,248	%	2,76	15,67	18,43	0,187	1,061	1,248	100,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	0,36	2,05	2,42	0,150	0,852	1,003	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	47,74	270,50	318,24	0,275	1,558	1,833	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	26,83	m2	1,422	%	4,02	22,80	26,83	0,213	1,209	1,422	100,00	
BETON LATEI 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	-	2,07	2,07	-	0,859	0,859	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	-	312,99	312,99	-	1,802	1,802	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	26,83	m2	1,816	%	-	26,83	26,83	-	1,816	1,816	100,00	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	-	0,78	0,78	-	0,325	0,325	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	-	119,02	119,02	-	0,685	0,685	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	24,59	m2	1,304	%	-	24,59	24,59	-	1,304	1,304	100,00	
				14,414	%				1,143		14,414		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-	-	-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAR	765,00	cm	1,610	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m'	3,390	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang saklar LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%	-	-	-	-	-	-	-	
				12,640	%				-	-	-	-	
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI								32,62	24,716	57,334		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%						11,035		
	DEVIASI										46,299		Mendahului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 7 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 8 s/d 14 April 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	51,11	1,265
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	100,00	1,786
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	64,77	12,443
III	PEKERJAAN BETON	14,515	100,00	14,515
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	64,59	1,292
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	42,46	11,619
III	PEKERJAAN BETON	14,414	100,00	14,414
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	57,334
REALISASI PEKERJAAN		57,334	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		11,035	%	
DEVIASI		46,299	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 14 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEKERJAAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 02/160/PPK/01/2024
NILAI KONTRAK : Rp253.750.447,48
TGL KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL KONTRAK ADD :
Minggu ke : 4 (EMPAT)
Tanggal : 8 s/d 14 April 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MC 0		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyel. sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m ²	0,747	%	25,00		25,00	0,747	-	0,747	100,00	PRESTASI PEKERJAAN : - Minggu lalu : 57,334
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%	0,30		0,30	0,088	-	0,088	30,00	
3	Penyelenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%	0,30		0,30	0,431	-	0,431	30,00	- Minggu ini : 0,000
				2,476	%				1,265		1,265		- s/d Minggu ini : 57,334
B PEKERJAAN PAGAR BELAKANG													
I PEKERJAAN TANAH													
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	38,03		38,03	1,227	-	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	12,68		12,68	0,295	-	0,295	100,00	- Minggu ini : 11,035
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	2,81		2,81	0,264	-	0,264	100,00	- Percepatan/ : 46,299
				1,786	%				1,786		1,786		
II PEKERJAAN PASANGAN													
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	22,95		22,95	6,166	-	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	69,70	m2	4,313	%	69,70		69,70	4,313	-	4,313	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	71,76		71,76	1,363	-	1,363	40,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	-		-	-	-	-	-	
5	Sponengan	225,50	m ²	1,898	%	-		-	-	-	-	-	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,86	m2	0,600	%	26,86		26,86	0,600	-	0,600	100,00	
				19,211	%				12,443		12,443		
III PEKERJAAN BETON													
a. FOOT PLAT													
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-5) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,26		0,26	0,098	-	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,79		0,79	0,327	-	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	67,29		67,29	0,387	-	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakal)	6,30	m2	0,325	%	6,30		6,30	0,325	-	0,325	100,00	
b. SLOOF 15x20													
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	29,14	m2	1,545	%	29,14		29,14	1,545	-	1,545	100,00	
c. KOLOM 15x25													
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	2,68		2,68	1,111	-	1,111	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	267,51		267,51	1,540	-	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	35,70	m2	2,417	%	35,70		35,70	2,417	-	2,417	100,00	
d. RING BALOK 15x20													
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	29,14	m2	1,973	%	29,14		29,14	1,973	-	1,973	100,00	
				14,515	%				14,515		14,515		
IV PEKERJAAN CAT													
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%	-		-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%	-		-	-	-	-	-	
				5,591	%				-		-		
C PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING													
I PEKERJAAN TANAH													
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	28,78		28,78	0,928	-	0,928	100,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	4,80		4,80	0,112	-	0,112	50,00	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	2,68		2,68	0,252	-	0,252	100,00	
				2,001	%				1,292		1,292		
II PEKERJAAN PASANGAN													
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	22,15		22,15	5,950	-	5,950	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	117,87		117,87	5,668	-	5,668	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%	-		-	-	-	-	-	
5	Sponengan	174,86	m ²	1,472	%	-		-	-	-	-	-	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	-		-	-	-	-	-	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%	-		-	-	-	-	-	
				27,366	%				11,519		11,519		
III PEKERJAAN BETON													
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	1,11		1,11	0,459	-	0,459	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	287,99		287,99	1,658	-	1,658	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	18,43	m2	1,248	%	18,43		18,43	1,248	-	1,248	100,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	2,42		2,42	1,003	-	1,003	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	318,24		318,24	1,833	-	1,833	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	26,83	m2	1,422	%	26,83		26,83	1,422	-	1,422	100,00	
BETON LATEI 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	2,07		2,07	0,859	-	0,859	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	312,99		312,99	1,802	-	1,802	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	26,83	m2	1,816	%	26,83		26,83	1,816	-	1,816	100,00	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	0,78		0,78	0,325	-	0,325	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	119,02		119,02	0,685	-	0,685	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	24,59	m2	1,304	%	24,59		24,59	1,304	-	1,304	100,00	
				14,414	%				14,414		14,414		
VI PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN													
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-		-	-	-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-		-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAR	765,00	cm	1,610	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-		-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m ²	3,390	%	-		-	-	-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-		-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-		-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%	-		-	-	-	-	-	
				12,640	%				-		-		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI								57,334	-	57,334		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%						11,035		
	DEVIASI										46,299		Mendahului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI


MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 14 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA


ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN
LOKASI
KECAMATAN
SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN

: PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
: KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
: KARANGANYAR
: DANA ALOKASI UMUM
: 2024
: 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER


KONTRAKTOR PELAKSANA
NO KONTRAK
KONSULTAN PENGAWAS

: CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
: 027/160/PPK/III/2024
: CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 5 (LIMA)
PERIODE : 15 s/d 21 April 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	58,09	1,438
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	100,00	1,786
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	75,11	14,429
III	PEKERJAAN BETON	14,515	100,00	14,515
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	64,59	1,292
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	46,58	12,748
III	PEKERJAAN BETON	14,414	100,00	14,414
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	60,623
REALISASI PEKERJAAN		60,623	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		34,441	%	
DEVIASI		26,182	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI



MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 21 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA



ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
L O K A S I : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/160/PPK/II/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.750.447,48
TGL KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL KONTRAK ADD :
Minggu ke : 5 (LIMA)
Tanggal : 15 s/d 21 April 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MC U		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyelesaian sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m	0,747	%	25,00		25,00	0,747	-	0,747	100,00	- Minggu lalu : 57,334
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%	0,30	0,10	0,40	0,088	0,029	0,118	40,00	
3	Penyenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%	0,30	0,10	0,40	0,431	0,144	0,574	40,00	- Minggu ini : 3,288
				2,476	%				1,265		1,438		
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG												- s/d Minggu ini : 60,623
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	38,03		38,03	1,227	-	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	12,68		12,68	0,295	-	0,295	100,00	- Minggu ini : 34,441
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	2,81		2,81	0,264	-	0,264	100,00	
				1,786	%				1,785		1,785		- Percepatan/ : 26,182
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	22,95		22,95	6,166	-	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	89,70		89,70	4,313	-	4,313	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	71,76	89,70	161,46	1,363	1,704	3,067	90,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	-	17,94	17,94	-	0,283	0,283	10,00	
5	Sponengan	225,50	m	1,898	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,88	m2	0,600	%	26,88		26,88	0,600	-	0,600	100,00	
				19,211	%				12,443		14,429		
III	PEKERJAAN BETON												
a.	FOOT PLAT												
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,26		0,26	0,098	-	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,79		0,79	0,327	-	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	67,29		67,29	0,387	-	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakai)	6,30	m2	0,325	%	6,30		6,30	0,325	-	0,325	100,00	
b.	SLOOF 15x20												
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	29,14	m2	1,545	%	29,14		29,14	1,545	-	1,545	100,00	
c.	KOLOM 15x25												
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	2,68		2,68	1,111	-	1,111	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	267,51		267,51	1,540	-	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	35,70	m2	2,417	%	35,70		35,70	2,417	-	2,417	100,00	
d.	RING BALOK 15x20												
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	29,14	m2	1,973	%	29,14		29,14	1,973	-	1,973	100,00	
				14,513	%				14,513		14,513		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%	-		-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%	-		-	-	-	-	-	
				5,591	%				-	-	-	-	
G	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	28,78		28,78	0,928	-	0,928	100,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	4,80		4,80	0,112	-	0,112	50,00	
3	Urug tanah padat (Tanah Galian)	8,91	m3	0,297	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	2,68		2,68	0,252	-	0,252	100,00	
				2,001	%				1,292		1,292		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	22,15		22,15	5,950	-	5,950	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	117,87		117,87	5,668	-	5,668	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	-	59,42	59,42	-	1,129	1,129	35,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	169,78	m2	3,131	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sponengan	174,86	m	1,472	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%	-	-	-	-	-	-	-	
				27,365	%				11,519		12,748		
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	1,11		1,11	0,459	-	0,459	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	287,99		287,99	1,658	-	1,658	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	18,43	m2	1,248	%	18,43		18,43	1,248	-	1,248	100,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	2,42		2,42	1,003	-	1,003	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	318,24		318,24	1,833	-	1,833	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	26,83	m2	1,422	%	26,83		26,83	1,422	-	1,422	100,00	
BETON LATEI 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	2,07		2,07	0,859	-	0,859	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	312,99		312,99	1,802	-	1,802	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	26,83	m2	1,816	%	26,83		26,83	1,816	-	1,816	100,00	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	0,78		0,78	0,325	-	0,325	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	119,02		119,02	0,685	-	0,685	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	24,59	m2	1,304	%	24,59		24,59	1,304	-	1,304	100,00	
				14,414	%				14,414		14,414		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-		-	-	-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-		-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARA	765,00	cm	1,610	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-		-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m	3,390	%	-		-	-	-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-		-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-		-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%	-		-	-	-	-	-	
				12,540	%				57,334	3,288	60,623		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI												
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%							34,441	
	DEVIASI											26,182	Mendahului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 21 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 6 (ENAM)
PERIODE : 22 s/d 28 April 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	65,08	1,611
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	100,00	1,786
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	90,99	17,480
III	PEKERJAAN BETON	14,515	100,00	14,515
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	64,59	1,292
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	55,08	15,072
III	PEKERJAAN BETON	14,414	100,00	14,414
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	66,171
REALISASI PEKERJAAN		66,171	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		61,628	%	
DEVIASI		4,543	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 28 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KESIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR BEDIUNG/ BALAU KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DATA : DATA ALOKASI URMU
TARIKH ANGGAHAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/180/PPK/IV/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.750.447,49
TGL KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL KONTRAK ADD :
Minggu ke : 6 (ENAM)
Tanggal : 22 s/d 28 April 2024


No.	Uraian Pekerjaan	MC 0		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyel. sampel minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m	0,747	%	25,00		25,00	0,747	-	0,747	100,00	- Minggu lalu : 60,623
2	Pembersihan lapangan	1,00	ls	0,294	%	0,40	0,10	0,50	0,118	0,029	0,147	50,00	
3	Penyelenggaraan K3	1,00	ls	1,435	%	0,40	0,10	0,50	0,574	0,144	0,718	50,00	- Minggu ini : 5,548
				2,476	%	-			1,438		1,611		- s/d Minggu ini : 66,171
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	38,03		38,03	1,227	-	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengurangan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	12,68		12,68	0,295	-	0,295	100,00	- Minggu ini : 61,628
3	Pengurangan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	2,81		2,81	0,264	-	0,264	100,00	
				1,786	%	-			1,786		1,786		- Percepatan/ : 4,543
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	22,95		22,95	6,166	-	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	89,70		89,70	4,313	-	4,313	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	161,46	8,97	170,43	3,067	0,170	3,238	95,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	17,94	116,61	134,55	0,283	1,836	2,119	75,00	
5	Sponengan	225,50	m	1,898	%	-	124,03	124,03	-	1,044	1,044	55,00	
6	Memasang dinding lerawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,86	m2	0,600	%	26,86		26,86	0,600	-	0,600	100,00	
				19,211	%				14,429		17,480		
III	PEKERJAAN BETON												
a.	FOOT PLAT												
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,26		0,26	0,098	-	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,79		0,79	0,327	-	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	67,29		67,29	0,387	-	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakai)	6,30	m2	0,325	%	6,30		6,30	0,325	-	0,325	100,00	
b.	SLOOF 15x20												
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	29,14	m2	1,545	%	29,14		29,14	1,545	-	1,545	100,00	
c.	KOLOM 15x25												
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	2,68		2,68	1,111	-	1,111	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	267,51		267,51	1,540	-	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	35,70	m2	2,417	%	35,70		35,70	2,417	-	2,417	100,00	
d.	RING BALOK 15x20												
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	29,14	m2	1,973	%	29,14		29,14	1,973	-	1,973	100,00	
				14,515	%				14,515		14,515		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%	-	-	-	-	-	-	-	
				5,591	%	-	-	-	-	-	-	-	
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	28,78		28,78	0,928	-	0,928	100,00	
2	Pengurangan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	4,80		4,80	0,112	-	0,112	50,00	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pengurangan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	2,68		2,68	0,252	-	0,252	100,00	
				2,001	%	-			1,292		1,292		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	22,15		22,15	5,950	-	5,950	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	117,87		117,87	5,668	-	5,668	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	59,42	84,89	144,31	1,129	1,613	2,742	85,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%	-	19,88	19,88	-	0,313	0,313	10,00	
5	Sponengan	174,86	m	1,472	%	-	17,49	17,49	-	0,147	0,147	10,00	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	-	2,18	2,18	-	0,251	0,251	5,00	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan lampu nat	22,36	m2	2,893	%	-	-	-	-	-	-	-	
				27,366	%	-			12,748		16,072		
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	1,11		1,11	0,459	-	0,459	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	287,99		287,99	1,658	-	1,658	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	18,43	m2	1,248	%	18,43		18,43	1,248	-	1,248	100,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	2,42		2,42	1,003	-	1,003	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	318,24		318,24	1,833	-	1,833	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	26,83	m2	1,422	%	26,83		26,83	1,422	-	1,422	100,00	
BETON LAJER 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	2,07		2,07	0,859	-	0,859	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	312,99		312,99	1,802	-	1,802	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	26,83	m2	1,816	%	26,83		26,83	1,816	-	1,816	100,00	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f' = 14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	0,78		0,78	0,325	-	0,325	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	119,02		119,02	0,685	-	0,685	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	24,59	m2	1,304	%	24,59		24,59	1,304	-	1,304	100,00	
				14,414	%				14,414		14,414		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%	-	-	-	-	-	-	-	
3	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARA	765,00	cm	1,610	%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Instalasi kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m	3,390	%	-	-	-	-	-	-	-	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	bh	1,084	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,034	%	-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%	-	-	-	-	-	-	-	
				12,540	%				-		-		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI								60,623	5,548	66,171		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%								
	DEVIASI										4,543		Mendahului

Menyetujui :
Konsultan Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 28 April 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGA LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 7 (TUJUH)
PERIODE : 29 April s/d 5 Mei 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	72,06	1,784
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	100,00	1,786
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	97,92	18,812
III	PEKERJAAN BETON	14,515	100,00	14,515
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	-	-
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	70,18	1,404
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	78,94	21,602
III	PEKERJAAN BETON	14,414	100,00	14,414
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	26,82	3,390
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	77,707
REALISASI PEKERJAAN		77,707	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		74,055	%	
DEVIASI		3,652	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 5 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEDAHATAN : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DATA : DATA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. PUTRA WILAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/160/PPM/10/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.756.447,49
TGL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD :
NILAI ADENDUM :
TGL. KONTRAK ADD :
Minggu ke : 7 (TUJUH)
Tanggal : 29 April s.d 5 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	M3 0		Bobot	%	Volume			Presiasi Pekerjaan			Penyel. sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m ²	0,747	%	25,00		25,00	0,747	-	0,747	100,00	- Minggu lalu : 66,171
2	Pembelahan lapangan	1,00	ls	0,294	%	0,50	0,10	0,60	0,147	0,029	0,177	60,00	
3	Penyediaan K3	1,00	ls	1,435	%	0,50	0,10	0,60	0,718	0,144	0,861	60,00	- Minggu ini : 11,537
				2,476	%				1,811		1,784		- s/d Minggu ini : 77,707
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,03	m3	1,227	%	38,03		38,03	1,227	-	1,227	100,00	- Rencana
2	Pengukuran Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,68	m3	0,295	%	12,68		12,68	0,295	-	0,295	100,00	- Minggu ini : 74,055
3	Pengukuran 1 m3 dengan Pasir Urug	2,81	m3	0,264	%	2,81		2,81	0,264	-	0,264	100,00	
				1,786	%				1,786		1,786		- Percepatan/ : 3,652
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,95	m3	6,166	%	22,95		22,95	6,166	-	6,166	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2 bata, camp 1PC:8PP	89,70	m2	4,313	%	89,70		89,70	4,313	-	4,313	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	179,40	m2	3,408	%	170,43	5,38	175,81	3,238	0,102	3,340	98,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	179,40	m2	2,825	%	134,55	35,88	170,43	2,119	0,565	2,684	95,00	
5	Sponenagan	225,50	m ²	1,898	%	124,03	78,93	202,95	1,044	0,664	1,708	90,00	
6	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	26,86	m2	0,600	%	26,86		26,86	0,600	-	0,600	100,00	
				19,211	%				17,480		18,812		
III	PEKERJAAN BETON												
a. FOOT PLAT													
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-5) cm, w/c = 0,87	0,26	m3	0,098	%	0,26		0,26	0,098	-	0,098	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	0,79	m3	0,327	%	0,79		0,79	0,327	-	0,327	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	67,29	kg	0,387	%	67,29		67,29	0,387	-	0,387	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakal)	6,30	m2	0,325	%	6,30		6,30	0,325	-	0,325	100,00	
b. SLOOF 15x20													
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	29,14	m2	1,545	%	29,14		29,14	1,545	-	1,545	100,00	
c. KOLOM 15x25													
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,68	m3	1,111	%	2,68		2,68	1,111	-	1,111	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	267,51	kg	1,540	%	267,51		267,51	1,540	-	1,540	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	35,70	m2	2,417	%	35,70		35,70	2,417	-	2,417	100,00	
d. RING BALOK 15x20													
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,19	m3	0,907	%	2,19		2,19	0,907	-	0,907	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	258,58	kg	1,489	%	258,58		258,58	1,489	-	1,489	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	29,14	m2	1,973	%	29,14		29,14	1,973	-	1,973	100,00	
				14,515	%				14,515		14,515		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	349,68	m2	4,750	%								
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,842	%								
				5,591	%								
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,78	m3	0,928	%	28,78		28,78	0,928	-	0,928	100,00	
2	Pengukuran Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,59	m3	0,223	%	4,80	4,80	9,59	0,112	0,112	0,223	100,00	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	8,91	m3	0,597	%								
4	Pengukuran 1 m3 dengan Pasir Urug	2,68	m3	0,252	%	2,68		2,68	0,252	-	0,252	100,00	
				2,801	%				1,292		1,404		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,15	m3	5,950	%	22,15		22,15	5,950	-	5,950	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2 bata, camp 1PC:8PP	117,87	m2	5,668	%	117,87		117,87	5,668	-	5,668	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	169,78	m2	3,225	%	144,31	16,98	161,29	2,742	0,323	3,064	95,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	198,84	m2	3,131	%	19,88	69,59	89,48	0,313	1,098	1,409	45,00	
5	Sponenagan	174,86	m ²	1,472	%	17,49	43,72	61,20	0,147	0,368	0,515	35,00	
6	Pasang batu andesit	43,61	m2	5,026	%	2,18	34,89	37,07	0,251	4,020	4,272	85,00	
7	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,893	%		5,59	5,59		0,723	0,723	25,00	
				27,366	%				16,072		21,602		
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,459	%	1,11		1,11	0,459	-	0,459	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	287,99	kg	1,658	%	287,99		287,99	1,658	-	1,658	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakal)	18,43	m2	1,248	%	18,43		18,43	1,248	-	1,248	100,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,42	m3	1,003	%	2,42		2,42	1,003	-	1,003	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	318,24	kg	1,833	%	318,24		318,24	1,833	-	1,833	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	26,83	m2	1,422	%	26,83		26,83	1,422	-	1,422	100,00	
BETON LATEI 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,07	m3	0,859	%	2,07		2,07	0,859	-	0,859	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	312,99	kg	1,802	%	312,99		312,99	1,802	-	1,802	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakal)	26,83	m2	1,816	%	26,83		26,83	1,816	-	1,816	100,00	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	0,78	m3	0,325	%	0,78		0,78	0,325	-	0,325	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	119,02	kg	0,685	%	119,02		119,02	0,685	-	0,685	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakal)	24,59	m2	1,304	%	24,59		24,59	1,304	-	1,304	100,00	
				14,414	%				14,414		14,414		
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	198,84	m2	2,701	%								
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,666	%								
3	Membuat Tuisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAR	765,00	cm	1,510	%								
4	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,051	%								
5	Instalasi Kabelpembagi (2x1,5mm)	150,00	m ²	3,390	%		150,00	150,00		3,390	3,390	100,00	
6	Memasang lampu LED 5 watt	20,00	btr	1,084	%								
7	Memasang saklar ganda	1,00	btr	0,034	%								
8	Membuat Pintu Portal Besi pipa	2,00	ls	2,104	%								
				12,640	%						3,390		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI								66,171	11,537	77,707		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA												
	DEVIASI												
													Mendahului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA WILAYA KONTRUKSI




MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 5 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGA AKSITA



ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 8 (DELAPAN)
PERIODE : 6 s/d 12 Mei 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	71,88	1,780
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	91,49	1,634
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	123,41	23,708
III	PEKERJAAN BETON	14,515	88,20	12,802
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	82,15	4,593
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	64,05	1,281
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	91,00	24,903
III	PEKERJAAN BETON	14,414	95,19	13,721
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	47,19	5,965
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	90,388
REALISASI PEKERJAAN		90,388	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		83,170	%	
DEVIASI		7,218	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 12 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KESIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KARTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DATA : DATA ALOKASI UMUM
TAHUN AKHIR : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. PUTRA WILAJA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/160/PPK/10/2024
NILAI KONTRAK : Rp263.750.447,49
TGL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD : 027/224/PPK/1/2024
NILAI ADERDUAN : Rp290.050.916,00
TGL. KONTRAK ADD : 06 Mei 2024
Minggu ke : 8 (DELAPAN)
Tanggal : 6 s/d 12 Mei 2024


No.	Uraian Pekerjaan	CCO		Bobot	%	Volume			Prestasi Pekerjaan			Penyelesaian sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.			minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m ²	0,679	%	25,00		25,00	0,679	-	0,679	100,00	- Minggu lalu : 69,355
2	Pembersihan lapangan	1,00	is	0,268	%	0,60	0,10	0,70	0,161	0,027	0,187	70,00	
3	Penyenggaraan K3	1,00	is	1,305	%	0,60	0,10	0,70	0,783	0,130	0,913	70,00	- Minggu ini : 21,033
				2,252	%				1,623		1,760		
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG												- s/d Minggu ini : 90,388
I	PEKERJAAN TANAH												- Rencana
1	Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,28	m3	1,123	%	38,03	0,25	38,28	1,115	0,007	1,123	100,00	- Minggu ini : 83,170
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,76	m3	0,270	%	12,68	0,08	12,76	0,268	0,002	0,270	100,00	
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,82	m3	0,241	%	2,81	0,01	2,82	0,240	0,001	0,241	100,00	- Percepatan/ : 7,218
				1,634	%				1,624		1,634		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,94	m3	5,606	%	22,94		22,94	5,606	-	5,606	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	111,33	m2	4,868	%	89,70	21,63	111,33	3,922	0,946	4,868	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	316,24	m2	5,463	%	175,81	140,43	316,24	3,037	2,426	5,463	100,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	316,24	m2	4,528	%	170,43	145,81	316,24	2,440	2,088	4,528	100,00	
5	Sponengan	225,50	m ²	1,726	%	202,85	22,65	225,50	1,553	0,173	1,726	100,00	
6	Sponengan	165,62	m ²	0,951	%	165,62		165,62	-	0,951	0,951	100,00	
7	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	27,83	m2	0,566	%	26,86	0,97	27,83	0,546	0,020	0,566	100,00	
				23,708	%				17,105		23,708		
III	PEKERJAAN BETON												
a. FOOT PLAT													
1	Membuat karat kerja beton mutu f _c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,28	m3	0,093	%	0,26	0,01	0,28	0,089	0,004	0,093	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	0,83	m3	0,311	%	0,79	0,04	0,83	0,297	0,014	0,311	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	65,39	kg	0,342	%	65,39	-	65,39	0,342	-	0,342	100,00	
4	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	6,60	m2	0,309	%	6,30	0,30	6,60	0,295	0,014	0,309	100,00	
b. SLOOF 15x20													
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,788	%	2,09	-	2,09	0,788	-	0,788	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	228,76	kg	1,198	%	228,76	-	228,76	1,198	-	1,198	100,00	
7	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	27,83	m2	1,342	%	27,83	-	27,83	1,342	-	1,342	100,00	
c. KOLOM 15x25													
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	2,81	m3	1,058	%	2,68	0,13	2,81	1,010	0,048	1,058	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	259,54	kg	1,359	%	259,54	-	259,54	1,359	-	1,359	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	37,40	m2	2,303	%	35,70	1,70	37,40	2,198	0,105	2,303	100,00	
d. RING BALOK 15x20													
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,788	%	2,09	-	2,09	0,788	-	0,788	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	228,76	kg	1,198	%	228,76	-	228,76	1,198	-	1,198	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	27,83	m2	1,714	%	27,83	-	27,83	1,714	-	1,714	100,00	
				12,802	%				12,617		12,802		
IV	PEKERJAAN CAT												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	371,90	m2	4,593	%		371,90	371,90		4,593	4,593	100,00	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,765	%							-	
				5,359	%				6,000		4,593		
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING												
I	PEKERJAAN TANAH												
1	Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,52	m3	0,836	%	28,52		28,52	0,836	-	0,836	100,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,51	m3	0,201	%	9,51		9,51	0,201	-	0,201	100,00	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	7,91	m3	0,481	%	-		-	-	-	-	-	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,85	m3	0,244	%	2,68	0,17	2,85	0,229	0,014	0,244	100,00	
				1,763	%				1,267		1,281		
II	PEKERJAAN PASANGAN												
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	25,16	m3	6,147	%	22,15	3,01	25,16	5,411	0,736	6,147	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP	112,72	m2	4,929	%	112,72		112,72	4,929	-	4,929	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	129,55	m2	2,238	%	126,96		126,96	2,193	-	2,193	98,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	157,40	m2	2,254	%	149,53		149,53	2,141	-	2,141	95,00	
5	Sponengan	174,86	m ²	1,338	%	61,20	113,66	174,86	0,468	0,870	1,338	100,00	
6	Sponengan	160,26	m ²	0,920	%		40,07	40,07	-	0,230	0,230	25,00	
7	Pasang batu andesit	48,82	m ²	5,115	%	37,07	9,76	46,83	3,884	1,023	4,907	95,93	
8	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,631	%	5,59	16,77	22,36	0,658	1,973	2,631	100,00	
9	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	3,93	m2	0,386	%		3,93	3,93	-	0,386	0,386	100,00	
				25,959	%				19,685		24,903		
III	PEKERJAAN BETON												
BETON KOLOM 15x15													
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,417	%	1,11		1,11	0,417	-	0,417	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	266,85	kg	1,397	%	266,85		266,85	1,397	-	1,397	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	18,43	m2	1,135	%	18,43		18,43	1,135	-	1,135	100,00	
BETON SLOOF 15x15													
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	2,35	m3	0,886	%	2,35		2,35	0,886	-	0,886	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	282,84	kg	1,481	%	282,84		282,84	1,481	-	1,481	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	25,70	m2	1,239	%	25,70		25,70	1,239	-	1,239	100,00	
BETON LATE 15x15													
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,787	%	2,07	0,02	2,09	0,781	0,006	0,787	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	279,21	kg	1,462	%	279,21		279,21	1,462	-	1,462	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	25,70	m2	1,583	%	25,70		25,70	1,583	-	1,583	100,00	
PLAT													
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	0,75	m3	0,283	%	0,75		0,75	0,283	-	0,283	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	105,29	kg	0,551	%	105,29		105,29	0,551	-	0,551	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	23,56	m2	1,136	%	23,56		23,56	1,136	-	1,136	100,00	
PLAT RAM PINTU MASUK DAN KELUAR													
13	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f _c =14,5 Mpa (K175)	6,60	m3	2,490	%		1,65	1,65		0,623	0,623	25,00	
14	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	240,31	kg	1,258	%		120,15	120,15		0,629	0,629	50,00	
15	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	4,64	m2	0,224	%		2,32	2,32		0,112	0,112	50,00	
				18,330	%				12,352		18,721		
IV	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN												
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	157,40	m2	1,944	%		47,22	47,22		0,583	0,583	30,00	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,515	%		32,98	32,98		0,757	0,757	50,00	
3	Coating Batu alam	9,14	m2	0,122	%					-	-	-	
4	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARA	765,00	cm	1,464	%		765,00	765,00		1,464	1,464	100,00	
5	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,046	%		0,80	0,80		0,046	0,046	100,00	
6	Instalasi kabel pembagi (2x1,5mm)	150,00	m ²	3,083	%	150,00		150,00	3,083	-	3,083	100,00	
7	Memasang lampu LED 5 watt	19,00	bh	0,936	%					-	-	-	
8	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,031	%		1,00	1,00		0,031	0,031	100,00	
9	Membuat Pintu Portal Besi pipa	-	is									-	
10	Pintu Pagar Depan Rangka Hollow	11,00	m2	1,052	%							-	
				10,194	%				3,083		5,965		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI								69,355	21,033	90,388		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00	%						83,170		
	DEVIASI										7,218		Mendahului

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA WILAJA KONTRUKSI

MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 12 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGA LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 70 (TUJUH PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO KONTRAK : 027/160/PPK/III/2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ANGGAR LAKSITA

PERIODE LAPORAN
MINGGU KE : 9 (SEMBILAN)
PERIODE : 13 s/d 17 Mei 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TAHAP PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)	TINGKAT PENYELESAIAN TIAP BAGIAN PEKERJAAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,476	90,93	2,252
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG			
I	PEKERJAAN TANAH	1,786	91,49	1,634
II	PEKERJAAN PASANGAN	19,211	123,41	23,708
III	PEKERJAAN BETON	14,515	88,20	12,802
IV	PEKERJAAN CAT	5,591	95,84	5,359
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING			
I	PEKERJAAN TANAH	2,001	88,11	1,763
II	PEKERJAAN PASANGAN	27,366	94,86	25,959
III	PEKERJAAN BETON	14,414	113,29	16,330
VI	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN	12,640	80,65	10,194
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,000	%	100,000
REALISASI PEKERJAAN		100,000	%	
MENURUT TIME SCHEDULE		92,772	%	
DEVIASI		7,228	%	MENDAHULUI

Menyetujui :
Kontraktor Pelaksana
CV.PUTRA WIJAYA KONTRUKSI



MUHAMAD EKBAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 17 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGAR LAKSITA



ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR GEJUNG/ BALAI/ KANTOR
LOKASI : KANTOR DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN : KARANGANYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. PUTRA WIJAYA KONTRUKSI
NO. SPK : 027/180/PPK/II/2024
NILAI KONTRAK : Rp283.750.447,49
TGL. KONTRAK : 18 Maret 2024
NO. ADD : 027/220/PPK/II/2024
NILAI ADENDUM : Rp290.050.916,00
TGL. KONTRAK ADD : 06 Mei 2024
Minggu ke : 9 (SENILAIAN)
Tanggal : 13 s/d 17 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	MC 100		Bobot %	Volume			Presiasi Pekerjaan			Penyel. sampai minggu ini (%)	Keterangan
		VOLUME	SAT.		minggu lalu	minggu ini	s/d minggu ini	minggu lalu (%)	minggu ini (%)	s/d minggu ini (%)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											PRESTASI PEKERJAAN :
1	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	25,00	m²	0,679 %	25,00		25,00	0,679	-	0,679	100,00	- Minggu lalu : 90,388
2	Pembesihan lapangan	1,00	is	0,268 %	0,70	0,30	1,00	0,187	0,080	0,268	100,00	
3	Penyenggaraan K3	1,00	is	1,305 %	0,70	0,30	1,00	0,913	0,391	1,305	100,00	- Minggu ini : 9,612
				2,252 %				1,780		2,252		- s/d Minggu ini : 100,00
B	PEKERJAAN PAGAR BELAKANG											
I	PEKERJAAN TANAH											
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	38,28	m3	1,123 %	38,28		38,28	1,123	-	1,123	100,00	- Rencana
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	12,76	m3	0,270 %	12,76		12,76	0,270	-	0,270	100,00	- Minggu ini : 92,772
3	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,82	m3	0,241 %	2,82		2,82	0,241	-	0,241	100,00	
				1,634 %				1,634		1,634		- Percepatan/ : 7,228
II	PEKERJAAN PASANGAN											
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	22,94	m3	5,606 %	22,94		22,94	5,606	-	5,606	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t. 1/2bata, camp 1PC:8PP	111,33	m2	4,868 %	111,33		111,33	4,868	-	4,868	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	316,24	m2	5,463 %	316,24		316,24	5,463	-	5,463	100,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	316,24	m2	4,528 %	316,24		316,24	4,528	-	4,528	100,00	
5	Sponengan	225,50	m²	1,726 %	225,50		225,50	1,726	-	1,726	100,00	
6	Sponengan TIMPANG	165,62	m²	0,951 %	165,62		165,62	0,951	-	0,951	100,00	
7	Memasang dinding terawang (roster) camp 1 PC : 4 PP	27,83	m2	0,566 %	27,83		27,83	0,566	-	0,566	100,00	
				23,708 %				23,708		23,708		
III	PEKERJAAN BETON											
a. FOOT PLAT												
1	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	0,28	m3	0,093 %	0,28		0,28	0,093	-	0,093	100,00	
2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	0,83	m3	0,311 %	0,83		0,83	0,311	-	0,311	100,00	
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	65,39	kg	0,342 %	65,39		65,39	0,342	-	0,342	100,00	
4	Memasang bekisting untuk pondasi (3x pakai)	6,60	m2	0,309 %	6,60		6,60	0,309	-	0,309	100,00	
b. SLOOF 15x20												
5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,788 %	2,09		2,09	0,788	-	0,788	100,00	
6	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	228,76	kg	1,198 %	228,76		228,76	1,198	-	1,198	100,00	
7	Memasang bekisting untuk skoot (3x pakai)	27,83	m2	1,342 %	27,83		27,83	1,342	-	1,342	100,00	
c. KOLOM 15x25												
8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,81	m3	1,058 %	2,81		2,81	1,058	-	1,058	100,00	
9	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	259,54	kg	1,359 %	259,54		259,54	1,359	-	1,359	100,00	
10	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	37,40	m2	2,303 %	37,40		37,40	2,303	-	2,303	100,00	
d. RING BALOK 15x20												
11	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,788 %	2,09		2,09	0,788	-	0,788	100,00	
12	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	228,76	kg	1,198 %	228,76		228,76	1,198	-	1,198	100,00	
13	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	27,83	m2	1,714 %	27,83		27,83	1,714	-	1,714	100,00	
				12,802 %				12,802		12,802		
IV	PEKERJAAN CAT											
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	371,90	m2	4,593 %	371,90		371,90	4,593	-	4,593	100,00	
2	Pintu Pagar Belakang Rangka Hollow	8,00	m2	0,765 %	-	8,00	8,00	-	0,765	0,765	100,00	
				5,359 %				4,593		5,359		
C	PEKERJAAN PAGAR DEPAN & SAMPING											
I	PEKERJAAN TANAH											
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3	28,52	m3	0,836 %	28,52		28,52	0,836	-	0,836	100,00	
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	9,51	m3	0,201 %	9,51		9,51	0,201	-	0,201	100,00	
3	Urug tanah padat (Tanah cadas)	7,91	m3	0,481 %	-	7,91	7,91	-	0,481	0,481	100,00	
4	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2,85	m3	0,244 %	2,85		2,85	0,244	-	0,244	100,00	
				1,763 %				1,281		1,763		
II	PEKERJAAN PASANGAN											
1	Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP	25,16	m3	6,147 %	25,16		25,16	6,147	-	6,147	100,00	
2	Membuat dinding bt. merah t. 1/2bata, camp 1PC:8PP	112,72	m2	4,929 %	112,72		112,72	4,929	-	4,929	100,00	
3	Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm	129,55	m2	2,238 %	126,96	2,59	129,55	2,193	0,045	2,238	100,00	
4	Pemasangan 1 m2 Acian	157,40	m2	2,254 %	149,53	7,87	157,40	2,141	0,113	2,254	100,00	
5	Sponengan	174,86	m²	1,338 %	174,86		174,86	1,338	-	1,338	100,00	
6	Sponengan TIMPANG	160,28	m²	0,920 %	40,07	120,20	160,28	0,230	0,690	0,920	100,00	
7	Pasang batu andesit	48,82	m2	5,115 %	46,83	1,98	48,82	4,907	0,208	5,115	100,00	
8	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat	22,36	m2	2,631 %	22,36		22,36	2,631	-	2,631	100,00	
9	Pasang batu lempeng tdk beraturan tanpa nat TIMPANG	3,93	m2	0,386 %	3,93		3,93	0,386	-	0,386	100,00	
				25,959 %				24,903		25,959		
III	PEKERJAAN BETON											
BETON KOLOM 15x15												
1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	1,11	m3	0,417 %	1,11		1,11	0,417	-	0,417	100,00	
2	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	266,85	kg	1,397 %	266,85		266,85	1,397	-	1,397	100,00	
3	Memasang bekisting untuk kolom (3x pakai)	18,43	m2	1,135 %	18,43		18,43	1,135	-	1,135	100,00	
BETON SLOOF 15x15												
4	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,35	m3	0,886 %	2,35		2,35	0,886	-	0,886	100,00	
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	282,84	kg	1,481 %	282,84		282,84	1,481	-	1,481	100,00	
6	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	25,70	m2	1,239 %	25,70		25,70	1,239	-	1,239	100,00	
BETON LATEI 15x15												
7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	2,09	m3	0,787 %	2,09		2,09	0,787	-	0,787	100,00	
8	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	279,21	kg	1,462 %	279,21		279,21	1,462	-	1,462	100,00	
9	Memasang bekisting untuk balok (3x pakai)	25,70	m2	1,583 %	25,70		25,70	1,583	-	1,583	100,00	
PLAT												
10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	0,75	m3	0,283 %	0,75		0,75	0,283	-	0,283	100,00	
11	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	105,29	kg	0,551 %	105,29		105,29	0,551	-	0,551	100,00	
12	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	23,56	m2	1,136 %	23,56		23,56	1,136	-	1,136	100,00	
PLAT RAM PINTU MASUK DAN KELUAR												
13	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)	6,60	m3	2,490 %	1,65	4,95	6,60	0,623	1,868	2,490	100,00	
14	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	240,31	kg	1,258 %	120,15	120,15	240,31	0,629	0,629	1,258	100,00	
15	Memasang bekisting untuk sloof (3x pakai)	4,64	m2	0,224 %	2,32	2,32	4,64	0,112	0,112	0,224	100,00	
				16,330 %				13,721		16,330		
IV	PEKERJAAN CAT DAN LAIN LAIN											
1	Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior)	157,40	m2	1,944 %	47,22	110,18	157,40	0,583	1,361	1,944	100,00	
2	Coating Batu alam	65,97	m2	1,515 %	32,98	32,98	65,97	0,757	0,757	1,515	100,00	
3	Coating Batu alam TIMPANG	9,14	m2	0,122 %	-	9,14	9,14	-	0,122	0,122	100,00	
4	Membuat Tulisan Stainless "DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR"	765,00	cm	1,464 %	765,00	-	765,00	1,464	-	1,464	100,00	
5	Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm	0,80	m2	0,046 %	0,80	-	0,80	0,046	-	0,046	100,00	
6	Instalasi kabel pembagi (2x1,5mm)	150,00	m³	3,083 %	150,00	-	150,00	3,083	-	3,083	100,00	
7	Memasang lampu LED 5 watt	19,00	bh	0,936 %	-	19,00	19,00	-	0,936	0,936	100,00	
8	Memasang saklar ganda	1,00	bh	0,031 %	1,00	-	1,00	0,031	-	0,031	100,00	
9	Membuat Pintu Portal Besi pipa	-	is									
10	Pintu Pagar Depan Rangka Hollow	11,00	m2	1,052 %	-	11,00	11,00	-	1,052	1,052	100,00	
				10,194 %				5,965		10,194		
	JUMLAH PROSENTASE S/D MINGGU INI							90,388	9,612	100,000		
	JUMLAH PROSENTASE MENURUT RENCANA			100,00 %						92,772		
	DEVIASI									7,228		Mendatului

Mengetahui :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA WIJAYA KONTRUKSI

MUHAMAD EKRAL KURNIAWAN
Pelaksana Lapangan

Karanganyar, 12 Mei 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ANGGRAR LAKSITA

ARIF RAHMANTO, ST
Pengawas Lapangan

FOTO DOKUMENTASI



PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/ KANTOR


LOKASI:

KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

SUMBER DANA:

DANA ALOKASI UMUM (DAU) KAB. KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024




CV. ANGGAR LAKSITA

Engineering Consultant & Supervisi

Alamat: Jetis RT 04 RW 01, Pule, Selogiri, Wonogiri.

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

0 %

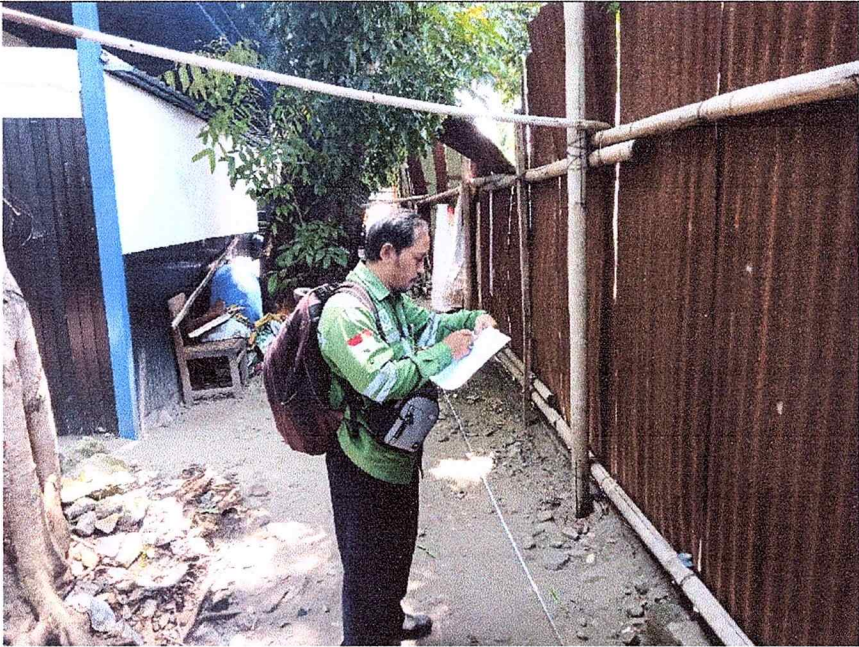

50 %




100 %



FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

0 %

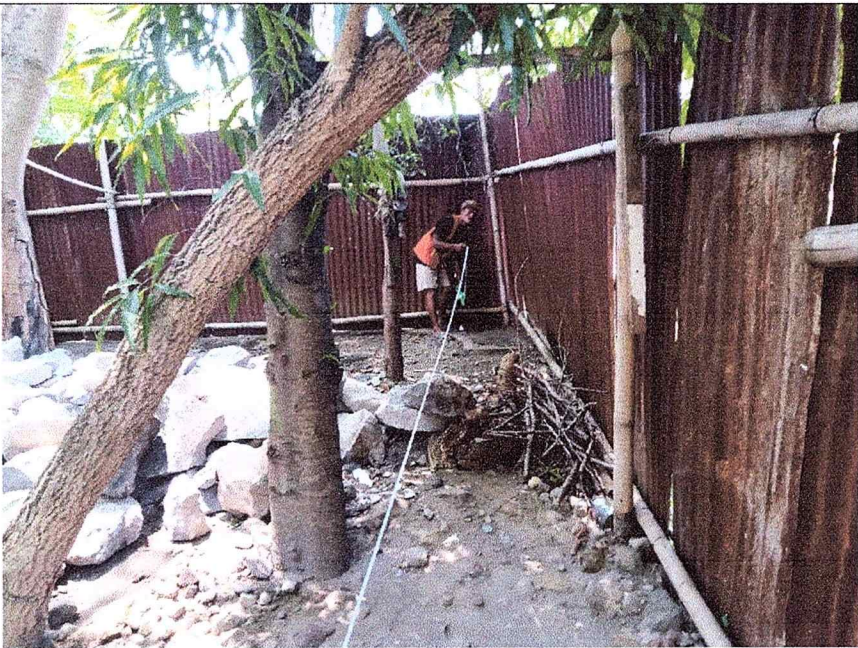

50 %



100 %



FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

0 %



50 %



100 %



FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR


0 %	
50 %	
100 %	

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

0 %	
50 %	
100 %	

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

50 %

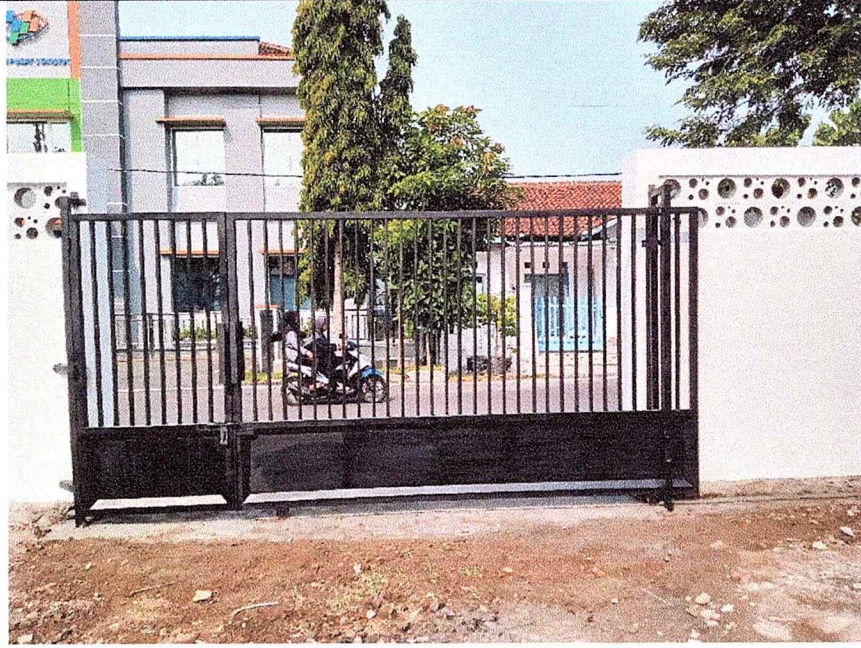

50 %



50 %



FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

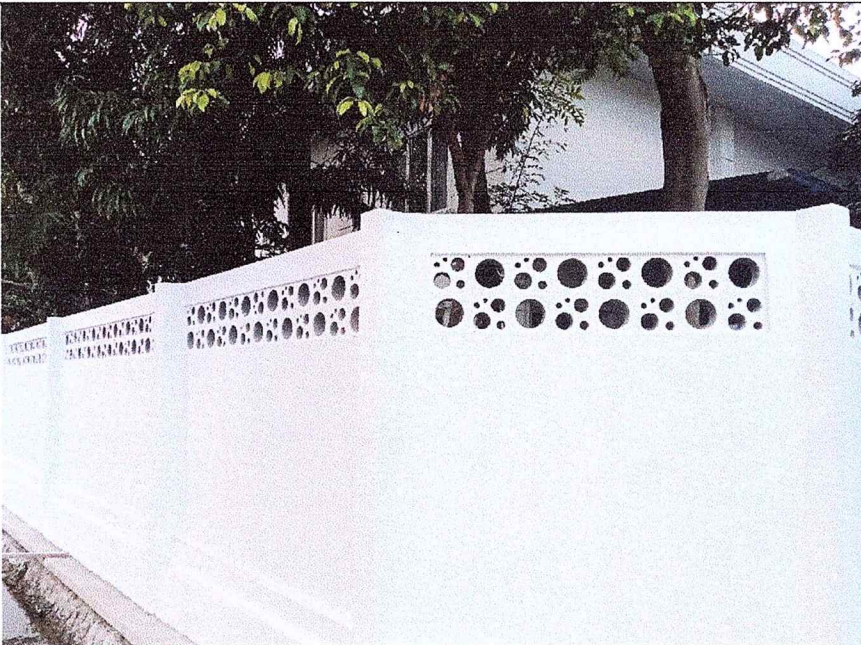
100 %	
100 %	
100 %	

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/ BALAI/ KANTOR DINAS PERTANIAN KAB. KARANGANYAR

Chek besi	
Chek besi	
Chek besi	
