

MUTUAL CHECK
MC 0

PAKET KEGIATAN :


Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan Bidang Bina Marga (Pembangunan Talud dan Gorong - Gorong Jalan Matesih - Tawangmangu)

SUMBER DANA :

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN :

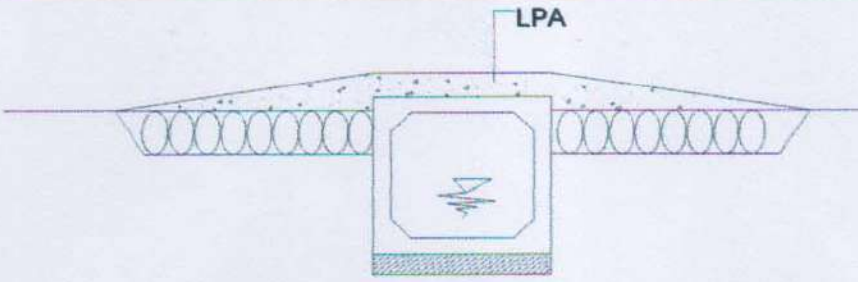


2026



KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. BANGUN NEGARA NUSANTARA

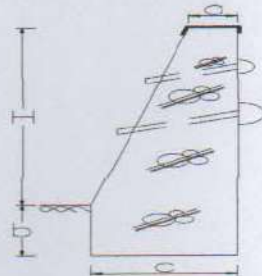
**BELANJA MODAL DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2026
MUTUAL CHECK MC-0**

KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan Bidang Bina Marga (Pembangunan Talud dan Gorong - Gorong Jalan Matesih - Tawangmangu)		KONTRAKTOR																													
PEKERJAAN : Galian, Box Culvert, LPA Kelas A, Beton Fc 15 Mpa		CV. BANGUN NEGARA NUSANTARA																													
STA :																															
URAIAN		VOLUME																													
																															
1 Galian SALURAN																															
<table><tr><td>P</td><td>x</td><td>L</td><td>x</td><td>T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8,00</td><td>x</td><td>2,50</td><td>x</td><td>2,30</td><td>=</td><td>46,00</td></tr></table>		P	x	L	x	T			8,00	x	2,50	x	2,30	=	46,00	46,00 M3															
P	x	L	x	T																											
8,00	x	2,50	x	2,30	=	46,00																									
2 BOX CULVERT 150 X 150 X 100																															
<table><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>8,00</td></tr></table>		P							8,00					=	8,00	8,00 M3															
P																															
8,00					=	8,00																									
3 Timbunan Lapis Pondasi Kelas A																															
<table><tr><td>P</td><td>x</td><td>L</td><td>x</td><td>T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8,00</td><td>x</td><td>0,60</td><td>x</td><td>2,30</td><td>=</td><td>11,04</td></tr><tr><td>8,00</td><td>x</td><td>1,80</td><td>x</td><td>0,30</td><td>=</td><td>4,32</td></tr><tr><td>11,00</td><td>x</td><td>5,00</td><td>x</td><td>0,15</td><td>=</td><td>8,25</td></tr></table>		P	x	L	x	T			8,00	x	0,60	x	2,30	=	11,04	8,00	x	1,80	x	0,30	=	4,32	11,00	x	5,00	x	0,15	=	8,25	23,61 M3	
P	x	L	x	T																											
8,00	x	0,60	x	2,30	=	11,04																									
8,00	x	1,80	x	0,30	=	4,32																									
11,00	x	5,00	x	0,15	=	8,25																									
4 Campuran Aspal Panas																															
<table><tr><td>P</td><td>x</td><td>L</td><td>x</td><td>T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12,40</td><td>x</td><td>4,70</td><td>x</td><td>0,04</td><td>=</td><td>2,33</td></tr></table>		P	x	L	x	T			12,40	x	4,70	x	0,04	=	2,33	2,33 M3															
P	x	L	x	T																											
12,40	x	4,70	x	0,04	=	2,33																									
5 Beton Bahu Jalan Fc 15 Mpa kiri																															
<table><tr><td>P</td><td>x</td><td>L</td><td>x</td><td>T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13,00</td><td>x</td><td>0,60</td><td>x</td><td>0,10</td><td>=</td><td>0,78</td></tr></table>		P	x	L	x	T			13,00	x	0,60	x	0,10	=	0,78																
P	x	L	x	T																											
13,00	x	0,60	x	0,10	=	0,78																									
5 Beton Bahu Jalan Fc 15 Mpa Kanan																															
<table><tr><td>P</td><td>x</td><td>L</td><td>x</td><td>T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15,00</td><td>x</td><td>1,40</td><td>x</td><td>0,10</td><td>=</td><td>2,10</td></tr></table>		P	x	L	x	T			15,00	x	1,40	x	0,10	=	2,10	2,88 m3															
P	x	L	x	T																											
15,00	x	1,40	x	0,10	=	2,10																									
DENGAN STA INI		PENGAWAS LAPANGAN																													
Galian 46,00 M3																															
Box Culvert 8,00 bh																															
LPA 23,61 M3		SUNANDAR PRIYA K. ST																													
CAP 2,33 M3		NIPPPK. 19910417 2025211 106																													
Beton fc 15 Mpa 2,88 M3		PELAKSANA																													
																															
		ARIS PURWANTO																													
		Pelaksana																													

BELANJA MODAL DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2026
MUTUAL CHECK MC-0

KEGIATAN	: Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan Bidang Bina Marga (Pembangunan Talud dan Gorong - Gorong Jalan Matesih - Pasangan Batu	KONTRAKTOR
PEKERJAAN	: Pasangan Batu	CV. BANGUN NEGARA NUSANTARA
STA	:	

URAIAN	VOLUME
--------	--------



1 Pasangan Batu Sayap Kanan Utara Gorong-Gorong		
P	= 9,50	
	2,4-2,9	
H	= 2,65	A = 0,4 B = 1,00 C = 1,00
1,00	x 1,00	x 9,50 = 9,50
0,40	+ 1,00	x 2,65 x 9,50 = 17,62
	2,00	
Timbunan biasa Dari Hasil galian		
T	L	P
2,65	x 1,20	x 9,50 = 15,11
	2,00	
Lantai Saluran Beton fc 15		
P	x L	x T
9,50	x 0,90	x 0,10 = 0,86
1,50	x 2,30	x 0,10 = 0,35

27,12 m3

15,11 m3

1,20 m3



4 Pasangan Batu Sayap Kanan selatan Gorong-Gorong		
P	= 3,20	
	2,7-3,3	
H	= 3,00	A = 0,4 B = 1,00 C = 1,00
1,00	x 1,00	x 3,20 = 3,20
0,40	+ 1,00	x 3,00 x 3,20 = 6,72
	2,00	
Timbunan biasa Dari Hasil galian		
T	L	P
3,00	x 1,20	x 3,20 = 5,76
	2,00	

9,92 m3

5,76 m3

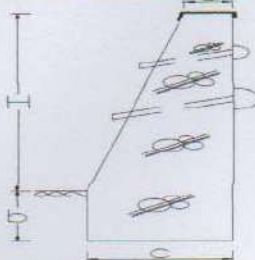
4 Pasangan Batu Pintu air Barat Gorong-Gorong		
P	= 0,60	
H	= 0,70	A = 0,3 B = 0,50 C = 0,30
0,50	x 0,30	x 0,60 x 2,00 = 0,18
0,30	+ 0,30	x 0,70 x 0,60 x 2,00 = 0,25
	2,00	

0,43 m3

VOLUME SAMPAI DENGAN STA INI	DITERIMA OLEH PENGAWAS LAPANGAN	DIMINTA OLEH PELAKSANA
Pasangan Batu 56,82 M1		
Timbunan Dari Sumber Galian 32,31 M3	SUNANDAR PRIYA K. ST	ARIS PURWANTO
Beton fc 15 Mpa 4,51 M3	NIPPPK. 19910417 2025211 106	Pelaksana

BELANJA MODAL DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2026
MUTUAL CHECK MC-0



KEGIATAN	: pemeliharaan jalan dari jembatan di bagian bina marga (Pembangunan Talud dan Gorong - Gorong Jalan Matesih - Tawangmangu)	KONTRAKTOR
PEKERJAAN	: Pasangan Batu	CV. BANGUN NEGARA NUSANTARA
STA	:	

URAIAN	VOLUME
	

1 Pasangan Batu Sayap SALURAN Gorong-Gorong Kiri		
P = 4,30	A = 0,3	B = 0,50
H = 1,80	C = 0,80	
0,50 x 0,80 x 4,30		X 2,00 = 3,44
0,30 + 0,80 x 1,80 x 4,30		X 2,00 = 8,51
2,00		
Timbunan biasa Dari Hasil galian		
T = 4,30	L = 1,00	P = 4,30
	2,00	
		= 9,25
		9,25 m3
Lantai Saluran Beton fc 15		
P = 4,30	L = 1,00	T = 0,10
		= 0,43
		0,43 m3

2 Pasangan Batu Sayap Gorong-Gorong Kiri		
P = 1,50	A = 0,3	B = 0,50
H = 1,60	C = 0,60	
0,50 x 0,60 x 1,50		= 0,45
0,30 + 0,60 x 1,60 x 1,50		= 1,08
2,00		
Timbunan biasa Dari Hasil galian		
T = 1,60	L = 0,60	P = 1,50
	2,00	
		= 0,72
		0,72 m3
LEINING		
T = 1,30	L = 0,40	P = 2,40
		JML = 2,00
		= 2,50
		2,50 m3

1 Pasangan Batu Gorong-Gorong KIRI		
P = 3,80	A = 0,3	B = 0,50
H = 1,30	C = 0,60	
0,50 x 0,60 x 3,80		= 1,14
0,30 + 0,60 x 1,30 x 3,80		= 2,22
2,00		
Timbunan biasa Dari Hasil galian		
T = 1,30	L = 0,60	P = 3,80
	2,00	
		= 1,48
		1,48 m3

VOLUME SAMPAI DENGAN STA INI	DITERIMA OLEH PENGAWAS LAPANGAN	DIMINTA OLEH PELAKSANA
Pasangan Batu 19,34 M3		
Timbunan Biasa dari hasil galian 11,45 M3	SUNANDAR PRIYA K. ST	ARIS PURWANTO
Beton fc 15 Mpa 3,31	NIPPPK. 19910417 2025211 106	Pelaksana
