



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Lawu No. 371 Telp. (0271) – 495007 fax (0271) 495828 Karanganyar  
Kode Pos 57712

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 027/5.1.DAK.BM.Kra/PPK/IV/2022

Karanganyar, 28 April 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur CV. LEGRA SEJAHTERA

di

KARANGANYAR

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/  
Rehabilitasi Jalan Beruk - Wonokeling ( DAK Reguler )

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan penawaran Saudara nomor : 73688141/1/2022/4 tanggal 11 April 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk - Wonokeling ( DAK Reguler ) Tahun 2022 dan dari koreksi Aritmatika Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar dengan nilai sebesar Rp 2.852.556.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 156.890.500,00 (Seratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan masa berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender dari Bank Umum dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Karanganyar  
Pejabat Pembuat Komitmen

MARGONO, ST, MM

NIP. 19730104 200604 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar
2. Inspektorat Kabupaten Karanganyar
3. Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar

|                                                                   |                                                                             |                      |               |                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Kode RUP                                                          | 32123306                                                                    |                      |               |                                         |                                    |
| Nama Paket                                                        | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk - Wonokeling ( DAK Reguler ) |                      |               |                                         |                                    |
| Nama KLPD                                                         | Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar                                     |                      |               |                                         |                                    |
| Satuan Kerja                                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>KABUPATEN KARANGANYAR          |                      |               |                                         |                                    |
| Tahun Anggaran                                                    | 2022                                                                        |                      |               |                                         |                                    |
| Lokasi Pekerjaan                                                  | No. Provinsi Kabupaten/Kota                                                 |                      | Detail Lokasi |                                         |                                    |
|                                                                   | 1. Jawa Tengah Karanganyar (Kab.) Kecamatan Jatiyoso Kab. Karanganyar       |                      |               |                                         |                                    |
| Volume Pekerjaan                                                  | 1 Paket                                                                     |                      |               |                                         |                                    |
| Uraian Pekerjaan                                                  | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk - Wonokeling                 |                      |               |                                         |                                    |
| Spesifikasi Pekerjaan                                             | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan                                    |                      |               |                                         |                                    |
| Produk Dalam Negeri                                               | Ya                                                                          |                      |               |                                         |                                    |
| Usaha Kecil/Koperasi                                              | Ya                                                                          |                      |               |                                         |                                    |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi Tidak<br>Aspek Sosial Tidak<br>Aspek Lingkungan Tidak         |                      |               |                                         |                                    |
| Pra DIPA / DPA                                                    | Tidak                                                                       |                      |               |                                         |                                    |
| Sumber Dana                                                       | No.                                                                         | Sumber Dana          | T.A.          | KLPD                                    | MAK                                |
|                                                                   | 1.                                                                          | APBD                 | 2022          | Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003. |
|                                                                   |                                                                             |                      |               |                                         | Pagu 3.750.000.000                 |
|                                                                   |                                                                             |                      |               |                                         | Total Pagu 3.750.000.000           |
| Jenis Pengadaan                                                   | No.                                                                         | Jenis Pengadaan      | Pagu          | Jenis Pengadaan                         |                                    |
|                                                                   | 1.                                                                          | Pekerjaan Konstruksi | 3750000000    |                                         |                                    |
| Total Pagu                                                        | 3.750.000.000                                                               |                      |               |                                         |                                    |
| Metode Pemilihan                                                  | Tender                                                                      |                      |               |                                         |                                    |
| Pemanfaatan Barang/Jasa                                           | Mulai                                                                       | Akhir                |               |                                         |                                    |
|                                                                   | Agustus 2022                                                                | Agustus 2022         |               |                                         |                                    |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak                                        | Mulai                                                                       | Akhir                |               |                                         |                                    |
|                                                                   | Maret 2022                                                                  | Agustus 2022         |               |                                         |                                    |
| Jadwal Pemilihan Penyedia                                         | Mulai                                                                       | Akhir                |               |                                         |                                    |
|                                                                   | Januari 2022                                                                | Februari 2022        |               |                                         |                                    |
| Tanggal Perbarui Paket                                            | 2022-01-15 09:07:04.146                                                     |                      |               |                                         |                                    |



**BIDANG BINA MARGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**SPESIFIKASI TEKNIS**

---

**PEMELIHARAAN BERKALA / REHABILITASI JALAN  
BERUK - WONOKELING (DAK REGULER)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**SPEKIFIKASI TEKNIS**  
**KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA / REHABILITASI JALAN BERUK – WONOKELING**  
**(DAK REGULER)**  
**BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**


|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Latar Belakang</b>    | <p>Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat administrasi berada di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berada di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen serta Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Karanganyar sebagian merupakan dataran rendah, sebagian berupa daerah berbukit dan sebagian lagi dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Lawu.</p> <p>Letak geografis yang strategis dengan kondisi topografi yang beragam ini perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih, di mana jalan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh guna merealisasikan visi Bupati Karanganyar, yakni Bersama Membangun Karanganyar. Pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat tinggi yang menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak untuk mendukung pertumbuhan tersebut.</p> <p>Namun kenyataan yang ada, infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan. Kondisi ruas jalan yang ada termasuk Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk – Wonokeling (DAK Reguler), banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Struktur jalan yang kurang memadai akibat CBR tanah yang rendah sehingga dituntut penggantian lapis pondasi jalan yang lebih stabil dan membutuhkan biaya tinggi.</li><li>b. Pondasi jalan yang saat ini pada umumnya masih di bawah standar karena ketebalan lapis pondasi yang masih kurang, sehingga dalam mudah ambles dan terjadi kegagalan konstruksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pondasi sebelum mengganti lapis permukaan perkerasan.</li><li>c. Beban kendaraan yang makin lama makin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dibutuhkan konstruksi jalan dengan kemampuan daya dukung lebih tinggi.</li><li>d. Kondisi geometrik jalan yang masih di bawah standar, sehingga perlu perbaikan seperti penambahan lebar jalan dan perbaikan alinyemen untuk mencapai kelas jalan yang diinginkan.</li><li>e. Cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan yang berintensitas tinggi menyebabkan meningkatnya volume limpasan air permukaan. Untuk itu perlu penyempurnaan drainase agar air dapat mengalir lancar.</li></ul> |
| <b>2. Maksud dan Tujuan</b> | <p>Tujuan utamanya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dengan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Sasaran                                        |                    | Tersediannya penyedia jasa kontruksi dalam pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan kondisi baik untuk mendukung kegiatan masyarakat diwilayah Kabupaten Karanganyar.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                        |
| 4. Lokasi Kegiatan                                |                    | Adapun lokasi kegiatannya sebagai berikut :<br>Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk – Wonokeling (DAK Reguler)<br>□ Kec. Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                        |
| 5. Sumber Pendanaan/ Jumlah Dana                  |                    | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :<br>□ Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar<br><b>Jumlah Pagu Dana untuk Pekerjaan ini sebesar :<br/>Rp. 3.750.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                        |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan Penyelesaian Kegiatan |                    | Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender sejak SPMK dikeluarkan, dengan masa pemeliharaan 8 (delapan) bulan atau 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender setelah Penyerahan pertama pekerjaan (PHO).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                        |
| 7. Nama dan Organisasi                            |                    | Nama PPK : <b><u>MARGONO,ST,MM</u></b><br>NIP. 19730104 200604 1 005<br>Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar<br>Nama Program : Penyelenggaraan Jalan<br>Nama Kegiatan : Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk – Wonokeling (DAK Reguler)                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                        |
| 8. Lingkup Kegiatan                               |                    | Lingkup kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pekerjaan yang meliputi :<br><br>a. Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)<br>b. Lataston Lapis Aus (HRS-WC)<br>c. Beton , fc'15 Mpa<br>d. Pasangan Batu<br>e. Perbaiki Campuran Aspal Panas<br>f. Panjang rencana pekerjaan jalan : 4100 meter<br>g. Lebar rencana pekerjaan jalan : 3 meter<br><br>Selama kegiatan ini, Penyedia jasa harus selalu koordinasi dengan pihak Konsultan Pengawas dan PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar . |                        |                                                                                                                                                        |
| 9. Personil                                       |                    | Personil inti /Tenaga Ahli /Teknis /Terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                        |
| No                                                | Uraian             | Kualifikasi Minimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keahlian               | Ket                                                                                                                                                    |
| 1                                                 | Pelaksana Lapangan | SLTA sederajat pengalaman minimal 2 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SKT TS 028/ SKT TS 045 | SKT yang masih berlaku                                                                                                                                 |
| 2                                                 | Pelaksana K3       | SLTA sederajat pengalaman K3 0 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sertifikat K3          | Sertifikat diterbitkan sesuai Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 atau diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                                                                                        |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Peralatan                               | Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                                                                                        |                                                                                                   |
| A. Peralatan Konstruksi Utama antara lain : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                                                                                        |                                                                                                   |
| No                                          | Peralatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kapasitas Alat | Jumlah | Status Kepemilikan                                                                     | Keterangan                                                                                        |
| 1                                           | ASPHALT MIXING PLANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 Ton/Jam     | 1.00   | Peralatan dapat milik sendiri, sewa, beli dan/ milik pihak lain dengan perjanjian sewa | Perjanjian sewa harus disertai bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi kuasa |
| 2                                           | ASPHALT FINISHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 Ton         | 1.00   |                                                                                        |                                                                                                   |
| 3                                           | DUMP TRUCK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 M3           | 3.00   |                                                                                        |                                                                                                   |
| 4                                           | TANDEM ROLLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 - 8 Ton      | 1.00   |                                                                                        |                                                                                                   |
| 5                                           | PNEUMATIC TYRE ROLLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Ton         | 1.00   |                                                                                        |                                                                                                   |
| 11. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi | Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2 ) terlampir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                        |                                                                                                   |
| 12. Kualifikasi                             | <p>Persyaratan kualifikasi Badan Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;</li><li>2. Memiliki Sertifikat Izin Badan Usaha (NIB) dengan klasifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Bangunan Sipil, sub bidang klasifikasi SBU Pekerjaan Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003).</li><li>3. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid;</li><li>4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</li><li>5. Tidak masuk daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan pihak yang terkait, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas anama badan usaha tidak sedang dalam menjalani Sanksi Pidana.</li><li>6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.</li><li>7. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus jutarupiah);</li><li>b. Harus mempunyai paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).</li></ol></li></ol> |                |        |                                                                                        |                                                                                                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan :</p> <p><math>SKP = KP - P</math></p> <p>KP = nilai kemampuan paket dengan ketentuan</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan</p> <p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. Keluaran              | Tersedianya kondisi jalan yang mantap untuk Jalan Beruk - Wonokeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. Manfaat               | Kelancaran arus lalu lintas orang dan barang untuk Jalan Beruk - Wonokeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. Dampak                | Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Jalan Beruk - Wonokeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. Hal-hal lain          | Seluruh proses Tender akan diberhentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan Gagal. Seluruh peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. Out come dan Laporan  | <p>Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyedia Jasa harus membuat Gambar Shop Drawing ( Gambar Pelaksanaan di lapangan) dan Gambar As Built Drawing ( Gambar Terlaksana di lapangan) yang di tuangkan dalam laporan MC 0 % dan MC 100 %.</li><li>2. Fisik pekerjaan 100 % sesuai dengan Dokumen Kontrak dan Gambar Teknis.</li><li>3. Dokumen laporan-laporan yang menunjang kegiatan tersebut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laporan harian,Mingguan dan Bulanan.</li><li>b. Gambar MC 0 % dan MC 100% beserta Foto pendukung 0%,50% dan 100 %</li><li>c. Laporan laboratorium sebagai Pengendalian Mutu seperti Ekstrak Aspal serta lainnya yang ada kaitanya pekerjaan tersebut.</li></ol></li></ol> |
| 18. Produksi dalam Negeri | Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain KAK dengan pertimbangan keterbatasan bahan dalam negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19. Penutup               | Demikian Spesifikasi Teknis Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk – Wonokeling (DAK Reguler) ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Karanganyar, 17 Maret 2022  
Kepala Bidang BINA MARGA  
Kabupaten Karanganyar  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**MARGONO,ST,MM**

NIP. 19730104 200604 1 005

## BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

### I. SURAT PERJANJIAN

#### SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI JALAN BERUK – WONOKELING

(DAK REGULER)

Nomor : ..... / /IV/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh dua [*hari, tanggal, bulan diisi dengan huruf*], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal ....., antara:

Nama : MARGONO, S.T., M.M  
NIP : 19730104 200604 1 005  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga  
Berkedudukan di : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Canggakan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : ..... [nama wakli Penyedia]  
Jabatan : ..... [sesuai akta notaris]  
Berkedudukan di : ..... [alamat Penyedia]  
Akta Notaris Nomor : ..... [sesuai akta notaris]  
Tanggal : ..... [tanggal penerbitan akta]  
Notaris : ..... [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ..... [*nama badan usaha*] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk – Wonokeling (DAK Reguler) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk – Wonokeling (DAK Reguler) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base);
- 2. Lataston Lapis Aus (HRS-WC);
- 3. Beton , fc'15 Mpa;
- 4. Pasangan batu kali
- 5. Patching permukaan aspal menggunakan Perbaikan Campuran Aspal Panas
- 6. Panjang rencana pekerjaan jalan : 4100 meter
- 7. Lebar rencana pekerjaan jalan : 3 meter

#### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. .... (..... ditulis dalam huruf ..... ) dengan kode akun kegiatan ..... ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar T.A 2022
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : ..... .
- (4) Ketentuan tentang besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Perubahan besaran PPN menjadi tanggung jawab Penyedia.

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama),

lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).
- (3) Penyedia bertanggung jawab atas :
- a. Pelaksanaan Kontrak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia.....

Untuk dan atas nama  
Pejabat yang berwenang untuk  
menandatangani Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk Pejabat yang berwenang untuk  
menandatangani Kontrak maka rekatkan  
meterai Rp10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk Penyedia maka rekatkan meterai  
Rp10.000,00)]

[namalengkap]  
[jabatan]

MARGONO, S.T., M.M  
NIP. 19730104 200604 1 005

## II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

### SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

#### A. KETENTUAN UMUM

##### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4. Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5. Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban

dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.12. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.13. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1.16. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17. Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

- 1.22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
- 1.25. Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan Pejabat Penandatanganan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29. Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31. Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35. Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>1.36. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>1.37. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Penerapan            | <p>SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Bahasa dan Hukum     | <p>3.1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.3. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Korespondensi        | <p>4.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>4.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | <p>5.1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.</p> <p>5.2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.</p> <p>5.3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk</p> |

## menandatangani Kontrak

- |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | <p>6.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;</li><li>2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau</li><li>3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.</li></ol> <p>6.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.</p> <p>6.3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pemutusan Kontrak;</li><li>2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;</li><li>3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan</li><li>4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.</li></ol> <p>6.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>6.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 7. Asal Material/Bahan                                                                 | <p>7.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>7.2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>7.3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Pembukuan                                                                           | <p>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Perpajakan                             | Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Pengalihan Kontrak Seluruh            | <p>10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Pengabaian                            | Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Penyedia Mandiri                      | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. KSO                                   | KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan      | <p>14.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</p> |
| 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan | <p>15.1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>15.2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
  - 2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
  - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
  - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
  - 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

## 16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

## 17. Akses ke Lokasi Kerja

- 17.1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

- 17.2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
  - a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
  - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
  - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
  - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

## B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak
 

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

### B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
  - 19.1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
  - 19.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
  - 19.3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
  - 19.4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan

- dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
  - 19.6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. bukti sertifikat kompetensi:
      - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
      - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
    - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
    - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
    - d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
    - e. pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian
  - 19.7. Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
- 
- |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>20.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.</li> <li>20.2. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.</li> </ol>                                                                                                  |
| 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) | <ol style="list-style-type: none"> <li>21.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .</li> <li>21.2. RMPK disusun paling sedikit berisi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work</li> </ol> </li> </ol> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Method Statement);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.3.                                    | Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21.4.                                    | RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.5.                                    | Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.6.                                    | Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.7.                                    | Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) | <p>22.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>22.2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.</p> <p>22.3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.</p> <p>22.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>22.5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>22.6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.</p> |
| 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak  | <p>23.1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.</p> <p>23.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:</p> <p>a. Penerapan SMKK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RKK;</li> <li>2) RMPK;</li> <li>3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan</li> <li>4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada).</li> </ol>                                                                                                                                    |

- b. Rencana Kerja;
  - c. Organisasi kerja;
  - d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
  - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
  - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi
- 24.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
  - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/Pemeriksaan Bersama
- 25.1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%)
- 25.2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di

Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
  - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## B.2 Pengendalian Waktu

### 27. Masa Pelaksanaan

- 27.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

### 28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

### 29. Rapat Pemantauan

- 29.1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat

- tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
  - 29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat
30. Peringatan Dini
- 30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
  - 30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 31.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuankontrak kritis.
  - 31.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
    - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
    - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
    - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
  - 31.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*):
    - a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

## 32. Pemberian Kesempatan

- 32.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
  - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemberian kesempatan kepada

Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
    - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
  - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
  - b) Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
    - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
    - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
    - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 32.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
  - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

### B.3 Penyelesaian Kontrak

#### 33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <p>kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.</p> <p>33.12. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.</p> <p>33.13. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.</p> <p>33.14. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>33.15. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan</li> <li>bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.</li> </ol> <p>33.16. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.</p> <p>33.17. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>33.18. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.</p> |
| 34. Pengambilalihan                                                       | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan | <p>35.1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.</p> <p>35.2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B.4 Addendum                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36. Perubahan Kontrak                                                     | <p>36.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak</p> <p>36.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perubahan Harga Kontrak;
- 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
- 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
- 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

### 37. Perubahan Pekerjaan

37.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

### 38. Perubahan Harga

- 38.1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) penyesuaian harga; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
  - a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
  - f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
  - h. indeks yang digunakan dalam

- pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
- 39.1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
  - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - c. Keadaan Kahar.
- 39.3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara

tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

- 40.1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
  3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
  2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 40.3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/ penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 41.3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
  - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
  - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
  - b. Kurva S pekerjaan; dan
  - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5.
- 41.7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
  - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
  - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
  - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan

Rencana Kerja Penyedia.

- 41.10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
  - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
  - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 41.12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 41.14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

## B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

### 42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

### 43. Pemutusan Kontrak

- 43.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3. Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

- 43.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
  - 43.5. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
  - 44.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
    - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
    - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
    - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
    - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
    - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
    - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
    - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
    - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
    - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama

- Penyedia.
- 44.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
  - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
  - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5. Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
  - b. dokumen pendukung.
- 44.6. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
  - 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan
- 46.1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
  - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
  - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1

dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

- 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. Penyedia bertanggung jawab atas :
  1. Pelaksanaan Kontrak;
  2. Kualitas barang/jasa;
  3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
  4. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  5. Ketepatan tempat penyerahan.
- b. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- e. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

- h. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- i. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

## 52. Penanggungan Risiko

- 52.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
  - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 52.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan

hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53. Perlindungan Tenaga Kerja | <p>53.1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>53.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.</p> <p>53.3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>53.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian</p> |
| 54. Pemeliharaan Lingkungan   | <p>Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55. Asuransi                  | <p>55.1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. segala risiko terhadap kecelakaan;</li> <li>ii. kerusakan akibat kecelakaan.</li> </ul> </li> <li>b. kehilangan; dan/atau</li> <li>c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.</li> </ul> <p>55.2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.</p> <p>55.3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56. Tindakan Penyedia yang    | <p>56.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran ASSKK;
  - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran ASSKK;
  - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
  - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
  - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
  - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
  - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3. Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

## 57. Laporan Hasil Pekerjaan

- 57.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3. Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
  - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 57.7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58. Kepemilikan Dokumen                         | Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor | <p>59.1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan</li> <li>Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;</li> <li>Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;</li> </ol> </li> <li>Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;</li> <li>Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>59.2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>59.3. Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.</p> <p>59.4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.</p> <p>59.5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.</p> <p>59.6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis</p> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>59.7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>59.8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60. Penyedia Lain            | <p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61. Alih Pengalaman/Keahlian | <p>Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62. Pembayaran Denda         | <p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 63. Jaminan                  | <p>63.1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.</p> <p>63.2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>63.3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bank Umum;</li> <li>Perusahaan Asuransi;</li> <li>Perusahaan Penjaminan; atau</li> <li>lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan</li> </ol> |

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

- 63.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
  - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
  - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 63.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

#### D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li><li>b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li><li>c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ditetapkan dalam Kontrak.

- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

## 65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

## 66. Peristiwa Kompensasi

66.1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 66.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67. Tenaga Kerja Konstruksi                      | 67.1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.                                                                                                                                                     |
|                                                  | 67.2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan. |
| 68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama | 68.1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.                                                                                                                                                |
|                                                  | 68.2. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.                                                                                            |
|                                                  | 68.3. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah     |

#### F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- |                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69. Harga Kontrak | 69.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.                                          |
|                   | 69.2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:<br>1) beban pajak;<br>2) keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);<br>3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan<br>4) biaya penerapan SMKK. |
|                   | 69.3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.                                                                                          |
|                   | 69.4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.                                                 |
| 70. Pembayaran    | 70.1. Uang Muka                                                                                                                                                                             |
|                   | a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja                                                                                                                      |

konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

- b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

#### 70.2. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
  - 1) angsuran uang muka;
  - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
  - 3) denda (apabila ada);
  - 4) pajak; dan/atau
  - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai

subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia.
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 70.3. Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan.
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
  - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
  - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
  - 4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
  - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahkan oleh pihak manapun; dan
  - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh

- Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

#### 70.4. Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
  - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
  - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

#### 71. Hari Kerja

- 71.1. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

- 71.2. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
        - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
        - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
        - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
      - 71.3. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
      - 71.4. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
      - 71.5. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
    72. Perhitungan Akhir
      - 72.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
      - 72.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
    73. Penangguhan
      - 73.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
      - 73.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
      - 73.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau

kelalaian Penyedia.

- 73.4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia

## G. PENGAWASAN MUTU

### 74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

### 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 75.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

### 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 76.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

### 77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

## 78. Kegagalan Bangunan

- 78.1. Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi,

membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

- 78.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

#### H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### 79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3. Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
  - b. dewan sengketa konstruksi; atau
  - c. Pengadilan.
- 79.4. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

##### 80. Itikad Baik

- 80.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK(SSKK)

| Pasal dalam SSUK             | Ketentuan                                                                | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 & 4.2                    | Korespondensi                                                            | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar<br/>Nama : MARGONO, S.T.,M.M<br/>Alamat : Jl. Lawu No. 371, Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar<br/>Website : -<br/>E-mail : dpupr@karanganyarkab.go.id<br/>Fax. : (0271) 495828</p> <p>Penyedia Jasa :</p> <p>PT/CV : .....<br/>Nama : .....<br/>Alamat : .....<br/>.....<br/>Website : .....<br/>E-mail : .....<br/>Fax. : .....</p> |
| 4.2 & 5.1                    | Wakil Sah Para Pihak                                                     | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :<br/>Nama : .....<br/>Berdasarkan SK. ....</p> <p>Untuk Penyedia :<br/>Nama : .....<br/>Jabatan : .....<br/>Berdasarkan Surat Keputusan ..... nomor ..... tanggal ..... Tentang .....</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3.b & 6.3.c<br>44.4 & 44.6 | Pencairan Jaminan                                                        | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Karanganyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27.1                         | Masa Pelaksanaan                                                         | Masa Pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.4                         | Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)  | Tidak dilaksanakan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33.8                         | Masa Pemeliharaan                                                        | Masa Pemeliharaan berlaku selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33.19                        | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)                         | Tidak dilaksanakan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33.22                        | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak dilaksanakan Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35.1                         | Gambar As Built dan Pedoman                                              | Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Pengoperasian dan Perawatan/<br>Pemeliharaan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38.7     | Penyesuaian Harga                                                                                   | Penyesuaian harga tidak diberikan untuk paket kegiatan ini                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45.b     | Pembayaran Tagihan                                                                                  | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak          |
| 49.(i)   | Hak dan Kewajiban Penyedia                                                                          | Hak dan kewajiban Penyedia :<br>1. Mematuhi dan melaksanakan segala kewajiban akibat dari audit BPKP atau tim auditor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.<br>2. Melaksanakan petunjuk, arahan dari tim APIP Kabupaten Karanganyar serta tim pengawasan internal lainnya (Inspektorat,DPRD)                                                        |
| 56.3     | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56.3     | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan                                  | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58       | Kepemilikan Dokumen                                                                                 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan hanya untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak                                                                                     |
| 65       | Fasilitas                                                                                           | Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada Penyedia oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66.1.(h) | Persitiwa Kompensasi                                                                                | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70.1.(e) | Besaran Uang Muka                                                                                   | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Harga Kontrak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                         |
| 70.2.(d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan                                                                       | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan/ <i>Monthly Certificate</i> (MC)<br><br>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:<br>1. Laporan prestasi pekerjaan (MC) beserta backup quantity pekerjaan.<br>2. Berita Acara Pembayaran<br>3. Bukti pendukung berupa foto dokumentasi |

|          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.3.(e) | Pembayaran Bahan dan atau Peralatan                           | Tidak ada pembayaran material on-site                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70.4.c   | Denda akibat Keterlambatan                                    | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)                                                                                                                                                           |
| 78.2     | Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li><li>b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan</li></ul> |

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG\*)

| No | Mata Pembayaran | Satuan Ukuran | Kuantitas | Harga Satuan HPS (Rp) | Harga Satuan Penawaran (Rp) | % Terhadap HPS | Keterangan |
|----|-----------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| 1  | .....           | .....         | .....     | .....                 | .....                       | .....          | .....      |
| 2  | .....           | .....         | .....     | .....                 | .....                       | .....          | .....      |
| 3  | Dst             |               |           |                       |                             |                |            |

Catatan:  
\*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR  
(apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

| No | Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*) | Nama Subkontraktor**) | Alamat Subkontraktor**) | Kualifikasi Subkontraktor**) | Keterangan |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| 1  | .....                                   | .....                 | .....                   | .....                        | .....      |
| 2  | .....                                   | .....                 | .....                   | .....                        | .....      |
| 3  | Dst                                     |                       |                         |                              |            |

Catatan:  
\*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak.  
\*\*) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

| No | Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*) | Nama Subkontraktor**) | Alamat Subkontraktor**) | Kualifikasi Subkontraktor**) | Keterangan |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| 1  | .....                                   | .....                 | .....                   | .....                        | .....      |
| 2  | .....                                   | .....                 | .....                   | .....                        | .....      |
| 3  | Dst                                     |                       |                         |                              |            |

Catatan:  
\*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak  
\*\*) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

| No | Nama Personel Manajerial | Jabatan dalam Pekerjaan ini <sup>*)</sup> | Tingkat Pendidikan/ Ijazah | Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) <sup>*)</sup> | Sertifikat Kompetensi Kerja <sup>*)</sup> | Kete-rangan |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1. |                          | Pelaksana Lapangan                        | SLTA sederajat             | 2 tahun                                            | SKT TS 028/ SKT TS 045                    |             |
| 2. |                          | Pelaksana K3                              | SLTA sederajat             | 0 tahun                                            | Sertifikat K3                             |             |

Catatan:

- <sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
- <sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

| No | Nama Peralatan Utama <sup>*)</sup> | Merek dan Tipe <sup>**)</sup> | Kapasitas <sup>**)</sup> | Jumlah <sup>**)</sup> | Kondisi <sup>**)</sup> | Status Kepemilikan <sup>**)</sup> | Keterangan |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1. | Asphalt Mixing Plant               |                               | 60 Ton                   | 1 bh                  | Baik                   | Sewa/milik sendiri                |            |
| 2. | Asphalt Finisher                   |                               | 10 Ton                   | 1 bh                  | Baik                   | Sewa/milik sendiri                |            |
| 3. | Dump truck                         |                               | 5 m3                     | 3 bh                  | Baik                   | Sewa/milik sendiri                |            |
| 4. | Tandem Roller                      |                               | 6-8 ton                  | 1 bh                  | Baik                   | Sewa/milik sendiri                |            |
| 5. | Pneuma tic Tyre Roller             |                               | 10 Ton                   | 1 bh                  | Baik                   | Sewa/milik sendiri                |            |

Catatan:

- <sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
- <sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jl. LAWU NO. 371 KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN KARANGANYAR

# **DESIGN PERENCANAAN**

**PEKERJAAN:  
PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
BERUK - WONOKELING**

**LOKASI:  
KECAMATAN JATYOSO**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KONSULTAN PERENCANA  
CV. ARSITRA KONSULTAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jl. LAWU NO. 371 KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN KARANGANYAR

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KAMI BERTANGGUNG JAWAB ATAS**  
**DOKUMEN PERENCANAAN INI**  
**PENYEDIA JASA**  
**CV ARSITRA KONSULTAN**

MASTERIO PRAHARYA, ST.  
DIREKTUR

**MENGETAHUI**  
**KEPALA BIDANG BINA MARGA DPUPR**  
**KAB. KARANGANYAR**

MARGONO, ST, MM.  
NIP. 19730104 200604 1 005

**MENYETUJUI**  
**KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN**  
**BIDANG BINA MARGA DPUPR**  
**KAB. KARANGANYAR**

TRI WIYONO, ST, MT.  
NIP. 19740603 200501 1 007

**MENGESAHKAN**  
**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

Drs. TITIS SRI JAWOTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660923 198603 1 003



**DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK) PENUGASAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022**

**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING**

**NO. PAKET :  
NO. RUAS :  
NAMA RUAS :  
PROVINSI : JAWA TENGAH**



**CV. ARSITRA KONSULTAN**

**DIGAMBAR**

**DIRENCANAKAN**

**DIPERIKSA**

**DANU TRI A. ST**

**TEDY IWAN S.ST**

**MASTERO PRAHARYA, ST**

**JUDUL GAMBAR :**

**TYPICAL POTONGAN MELINTANG**



**NO LEMBAR : 1**

**JML LEMBAR : 17**

**SKALA 1:100**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>NAMA RUAS</b>  | <b>BERUK - WONOKELING</b> |
| <b>NOMOR RUAS</b> |                           |
| <b>KECAMATAN</b>  | <b>JATIYOSO</b>           |
| <b>KABUPATEN</b>  | <b>KARANGANYAR</b>        |
| <b>TAHUN</b>      | <b>2022</b>               |

# **PETA JARINGAN JALAN KABUAPTEN KARANGANYAR**

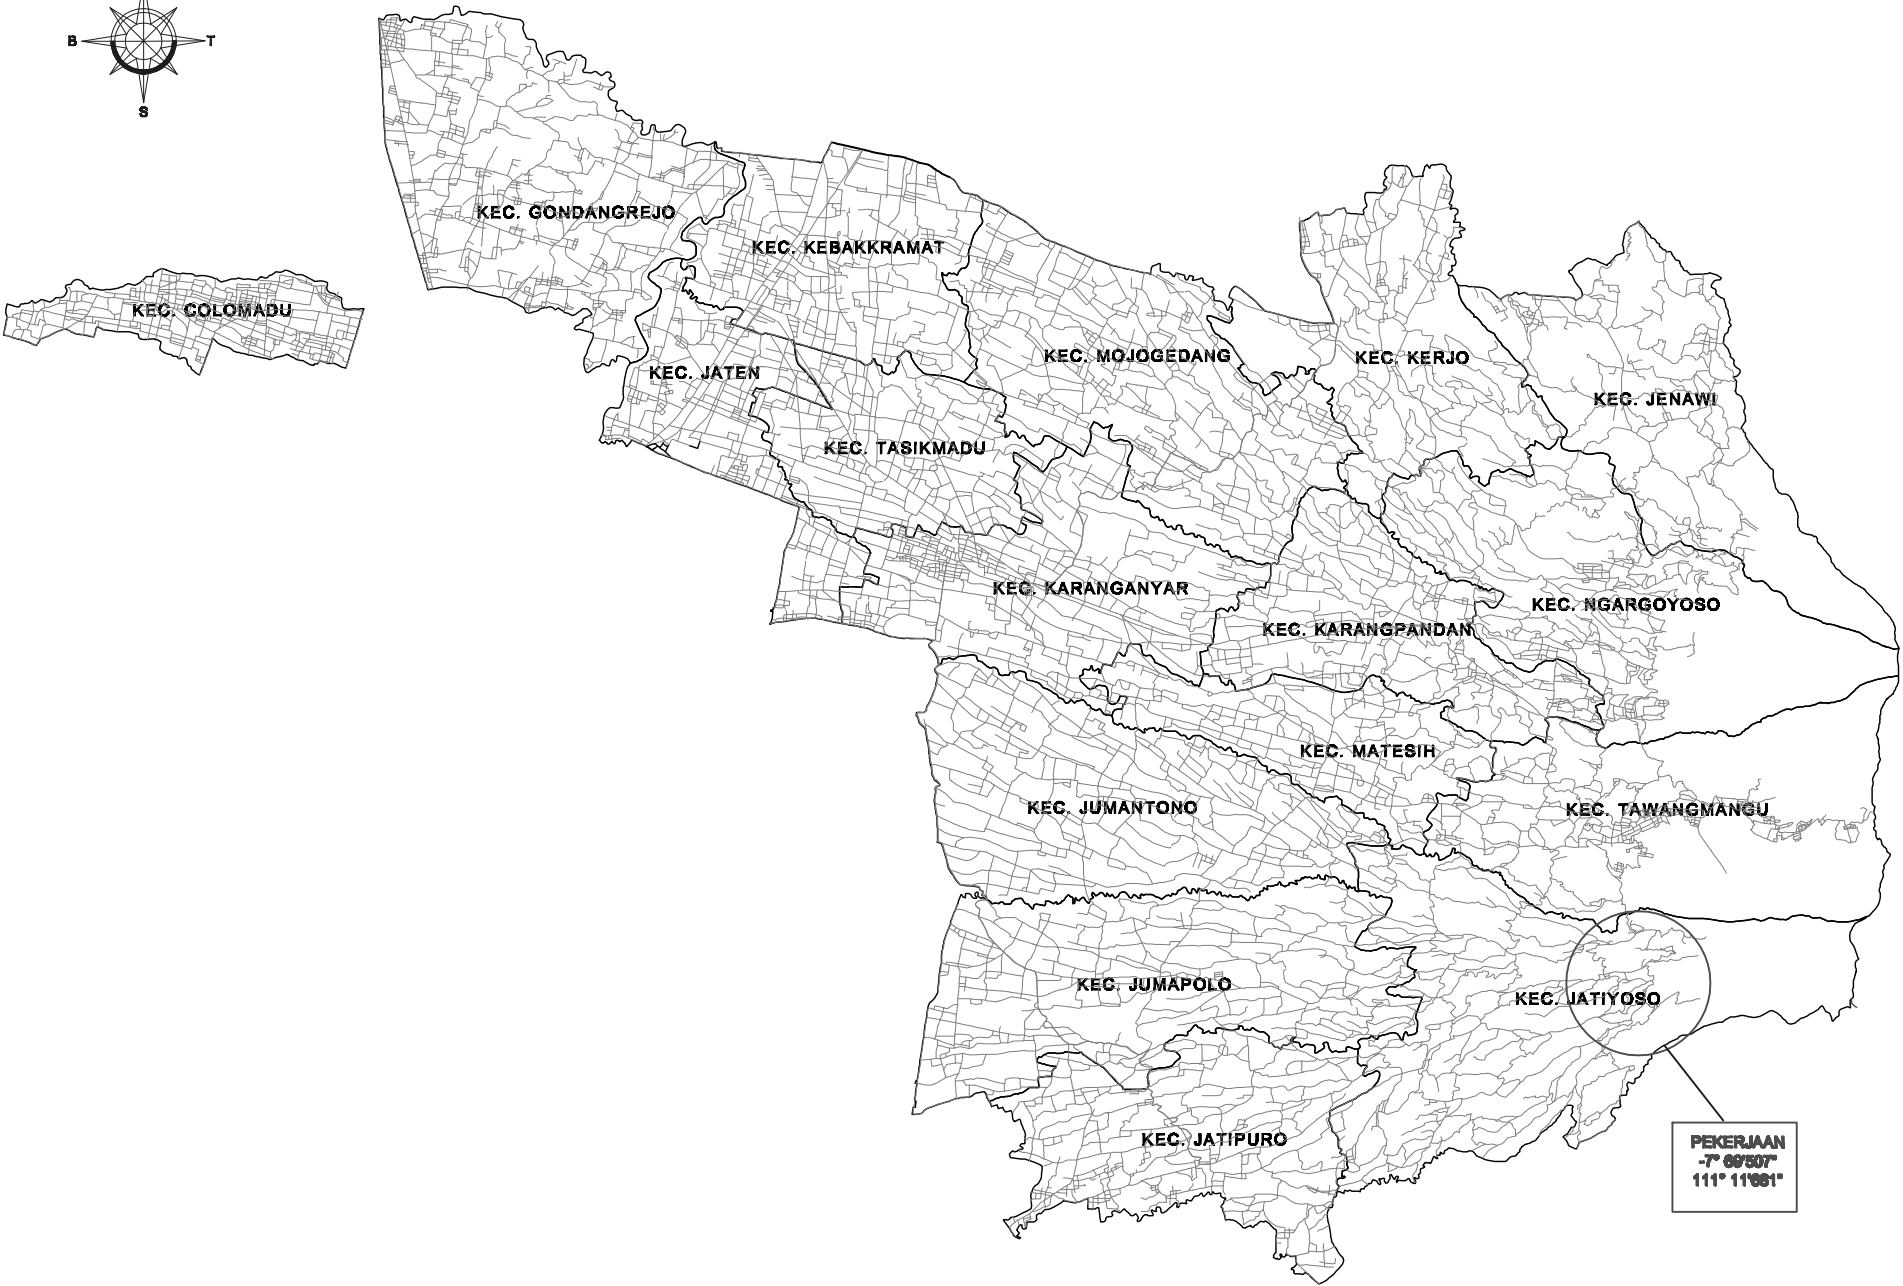



DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK) PENUGASAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING

NO. PAKET :  
NO. RUAS :  
NAMA RUAS :  
PROVINSI : JAWA TENGAH



CV. ARSITRA KONSULTAN

DIGAMBAR

DIRENCANAKAN

DIPERIKSA

DANU TRI A. ST

TEDY IWAN S.ST

MASTERO PRAHARYA, ST

JUDUL GAMBAR :



TYPICAL POTONGAN MELINTANG

NO LEMBAR : 2

JML LEMBAR :17

SKALA 1:100

|            |                    |
|------------|--------------------|
| NAMA RUAS  | BERUK - WONOKELING |
| NOMOR RUAS |                    |
| KECAMATAN  | JATIYOSO           |
| KABUPATEN  | KARANGANYAR        |
| TAHUN      | 2022               |

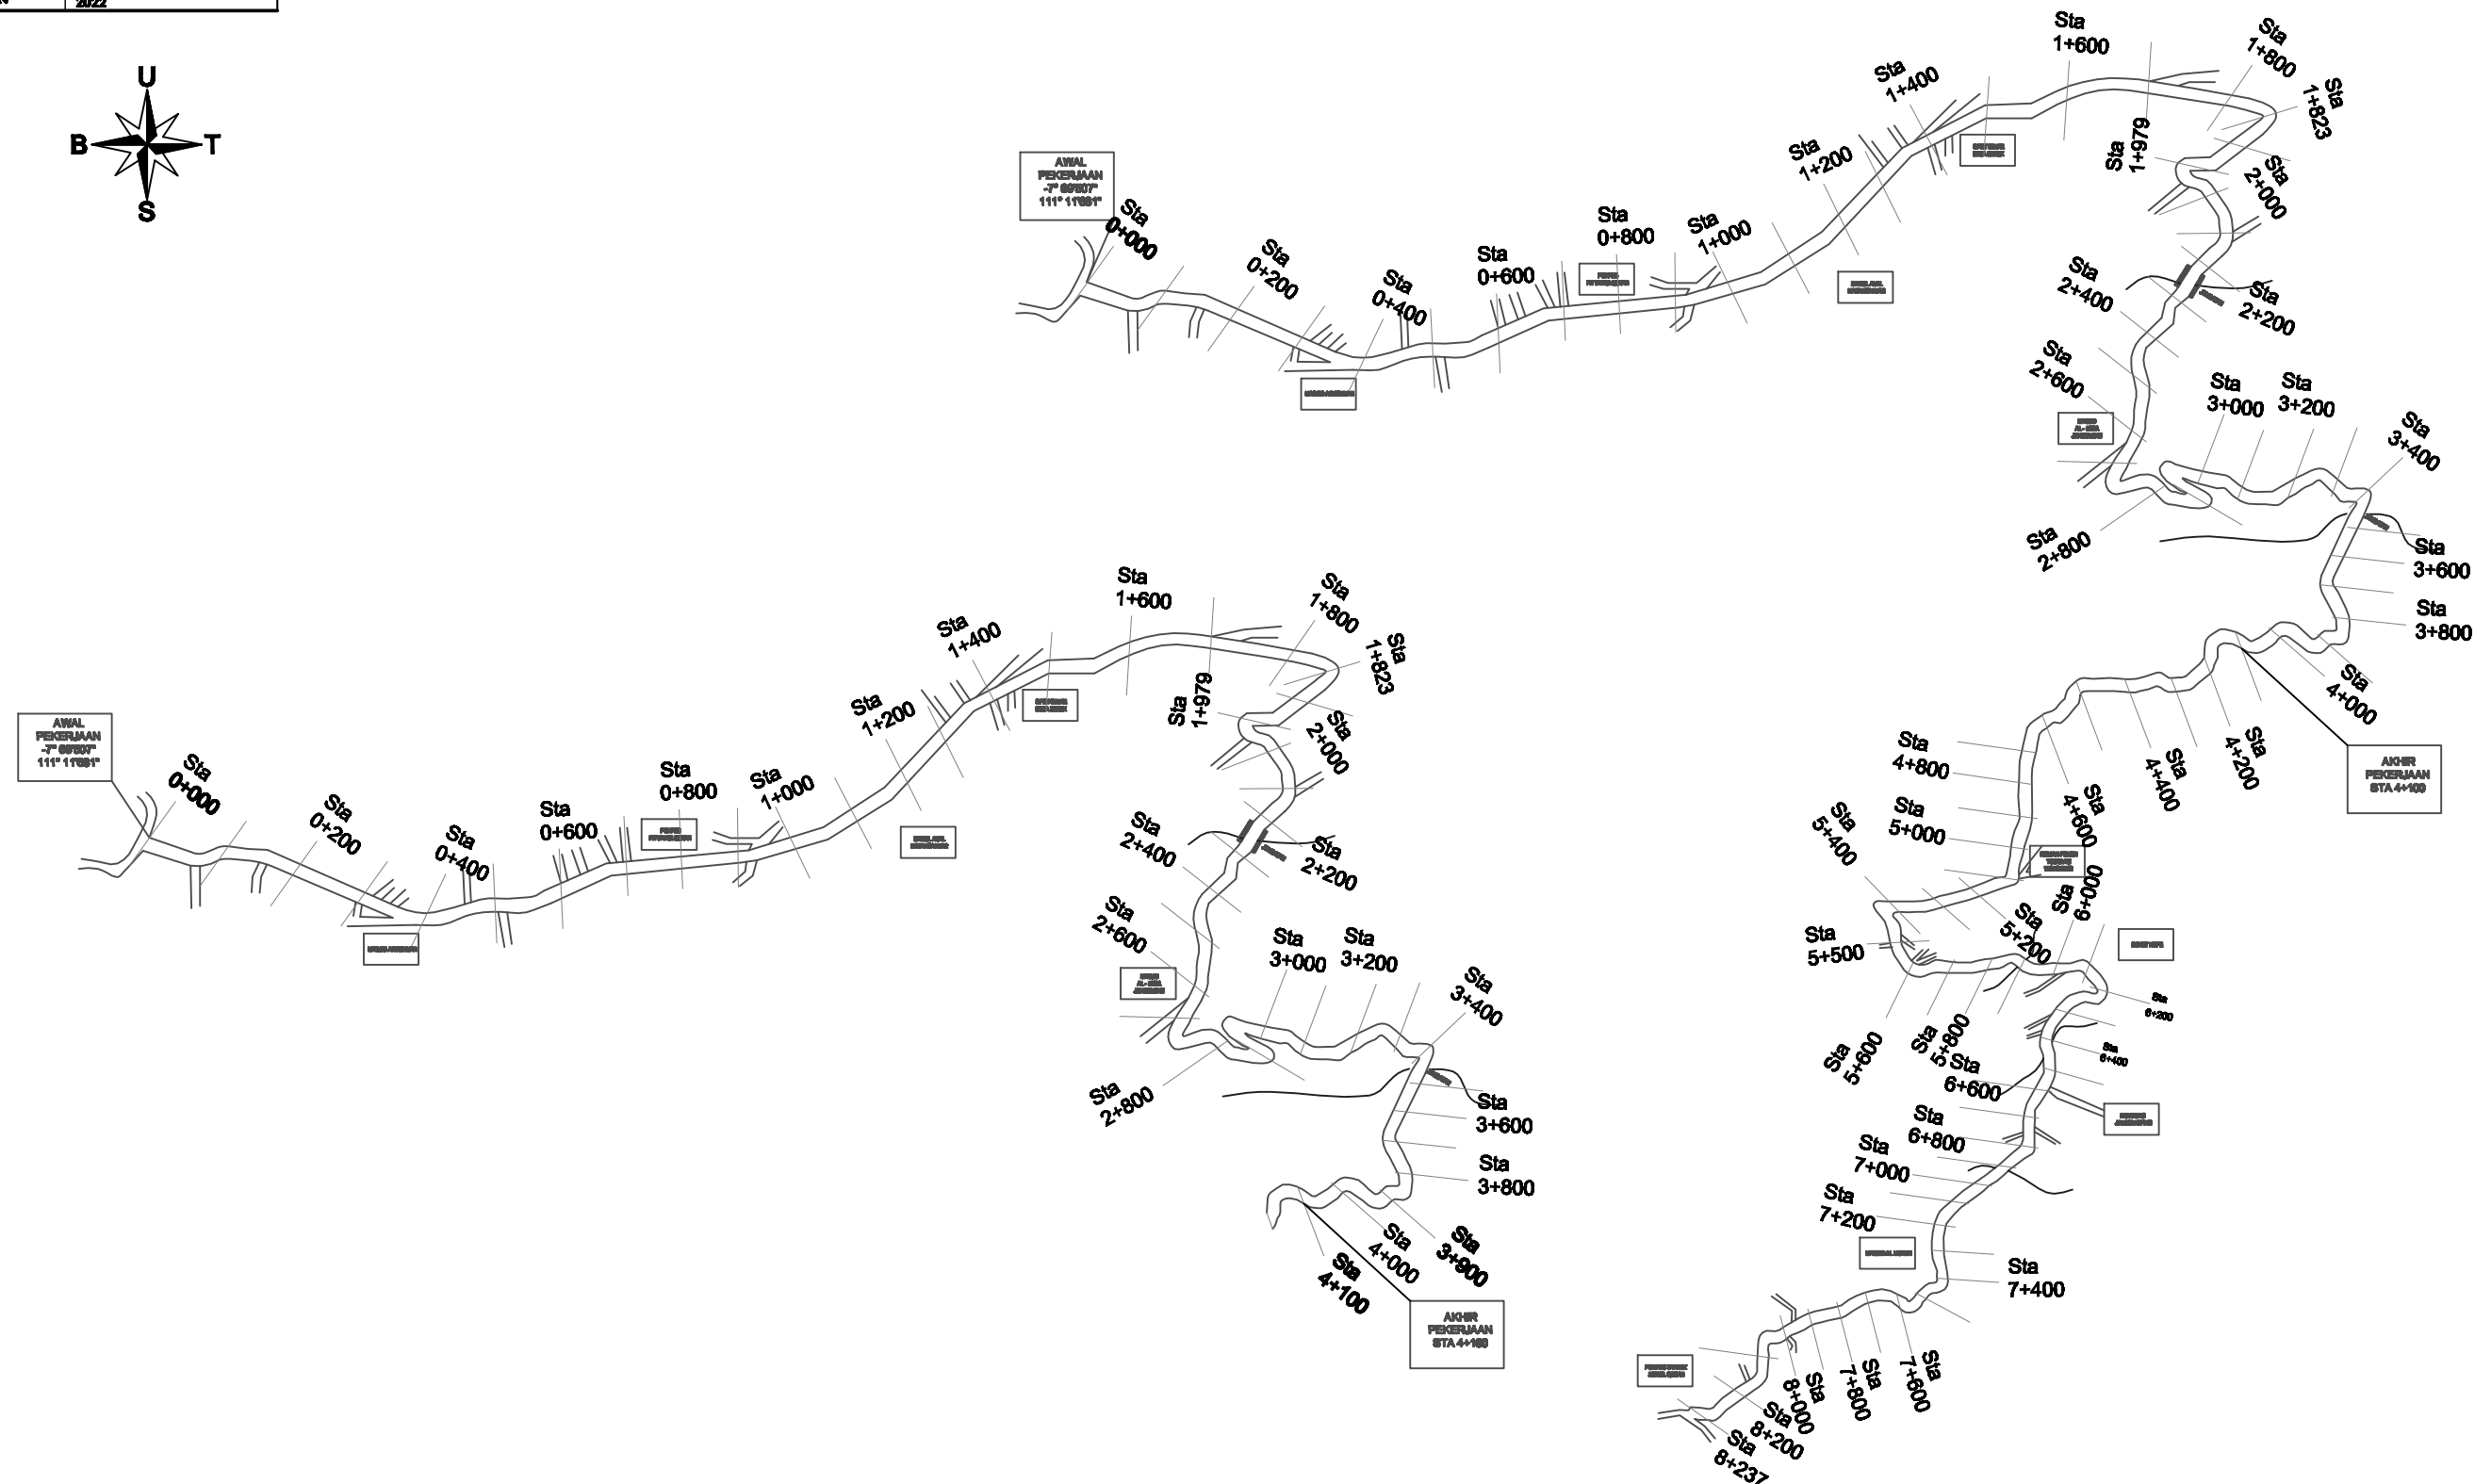



**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>NO. PAKET</b> | :                    |
| <b>NO. RUAS</b>  | :                    |
| <b>NAMA RUAS</b> | :                    |
| <b>PROVINSI</b>  | <b>: JAWA TENGAH</b> |

**CV. ARSITRA KONSULTAN**

# DIGAMBAR

**DIRENCANAKAN**

**DIPERIKSA**

**JUDUL GAMBAR :**

## TIPIKAL POTONGAN MELINTANG

**NO LEMBAR :3**

**JML LEMBAR : 17****SKALA 1:100**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>NAMA KUAS</b>  | <b>NGEMPLAK - TUNGGULREJO</b> |
| <b>NOMOR KUAS</b> |                               |
| <b>KECAMATAN</b>  | <b>METESEN</b>                |
| <b>KABUPATEN</b>  | <b>KARANGANYAR</b>            |
| <b>TAHUN</b>      | <b>2022</b>                   |


| NO | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PEKERJAAN PERKERASAN BAHU JALAN: GALIAN BIASA<br>BETON FC 15 MPA t=15cm, l=50cm<br>PLASTIK BETON<br>SEWA ACUAN BETON | 1. STA 0 + 800 - 1+ 000 KA - KI<br>STA 1 + 400 - 2+ 000 KA - KI<br>STA 2 + 000 - 2+ 200 KA<br>STA 2 + 200 - 2+ 400 KA - KI<br>STA 2 + 400 - 2+ 600 KA<br>STA 2 + 600 - 2+ 800 KA - KI<br>STA 2 + 800 - 4+ 100 KA |
| 2. | PEKERJAAN TALUD : TIMBUNAN PILIHAN<br>PASANGAN BATU                                                                  | 2. STA 0 + 900 - 0+ 950 KI<br>STA 3 + 100 - 3+ 250 KA                                                                                                                                                            |
| 3. | PEKERJAAN OVERLAY: LAPIS PEREKAT<br>HRS BASE t = 4cm<br>HRS WC t = 3 cm                                              | 3. STA 0 + 000 - 1+ 300 (lebar = 4m, Base dan WC)<br>STA 1 + 300 - 4+ 100 (lebar = 3m, Base dan WC)                                                                                                              |
| 4. | PEKERJAAN PATCHING:<br>CAMPURAN ASPAL PANAS UNTUK PEKERJAAN MINOR (ATB)                                              | 4. STA 0 + 000 - 0+ 800<br>STA 1 + 000 - 1+ 400<br>STA 2 + 000 - 2+ 800<br>STA 4 + 000 - 4+ 100                                                                                                                  |
| 5. | PEKERJAAN MARKA JALAN : TERMOPLASTIK lebar = 12 cm                                                                   | 5. STA 0 + 000 - 4+ 100                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |











**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>NO. PAKET</b> | :             |
| <b>NO. RUAS</b>  | :             |
| <b>NAMA RUAS</b> | :             |
| <b>PROVINSI</b>  | : JAWA TENGAH |

**CV. ARSITRA KONSULTAN**

## DIGAMBAR

## DIRENCANAKAN

**DIPERIKSA**

**JUDUL GAMBAR :**

NO LEMBAR :8



**JML LEMBAR :17**

### TYPIKAL POTONGAN MELINTANG

SKALA 1:100


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>NAMA RUAS</b>  | <b>BERUK - WONOKELING</b> |
| <b>NOMOR RUAS</b> |                           |
| <b>KECAMATAN</b>  | <b>JATIIOSO</b>           |
| <b>KABUPATEN</b>  | <b>KARANGANYAR</b>        |
| <b>TAHUN</b>      | <b>2022</b>               |

| LEGENDA                                           |  |
|---------------------------------------------------|--|
| LATASTON LAPIS ASB { HRS WC }                     |  |
| LATASTON LAPIS PONDASI { HRS BASE }               |  |
| CAMPURAN ASPAL PANAS UNTUK PERKERJAAN MINOR (ATB) |  |
| BETON FC'15 MPA                                   |  |
| PASANGAN BATU                                     |  |




| JENIS PEKERJAAN                            | SAT            | 4+000 S/D 4+100 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                            | MS             |                 |
| GALIAN BASA                                | MS             | 8.00            |
| TIMBUNAN PIL. DARI SUBL GALIAN             | MS             | -               |
| LAPIS PEREKAT - EMULSI                     | LITER          | 120.00          |
| LATASTON LAPIS FONDASI HRS - (BASE)        | TON            | 27.12           |
| LATASTON LAPIS AUS (HRS - WC)              | TON            | 20.34           |
| BETON MUTU RENDAH FC 15 MPa                | MS             | 7.50            |
| SEWA ALIYAN BETON                          | M <sup>3</sup> | 8.00            |
| PLASTIK BETON                              | M2             | 50.00           |
| PASANGAN BATU                              | MS             | -               |
| CAMPURAN ASPAL PANAS UNTUK PEKERJAAN MINOR | MS             | 8.15            |
| TERMOPLASTIK                               | MS             | 4.50            |

## EKSISTING

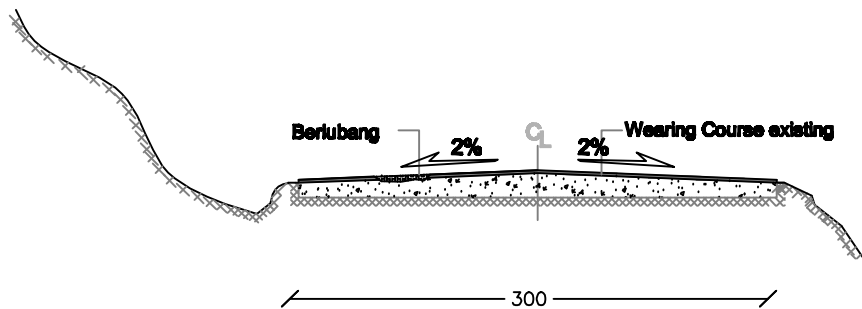**STA 0+000 S/D STA 4+100**

## RENCANA

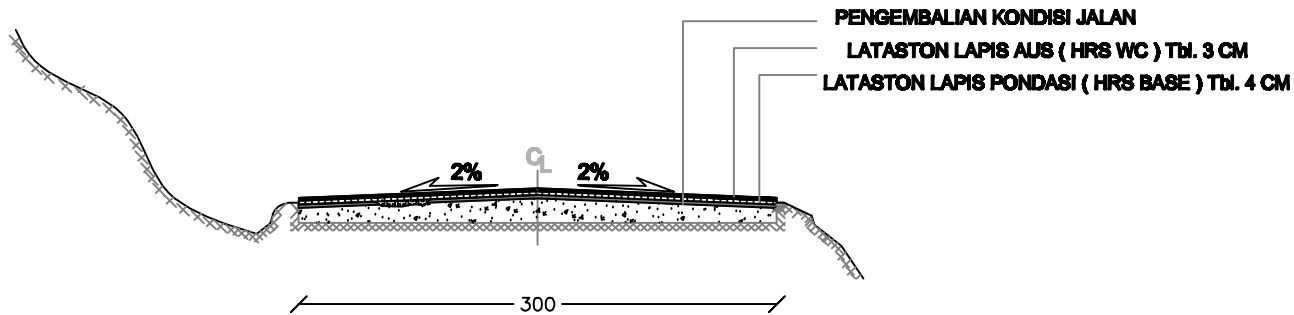**STA 0+000 S/D STA 4+100**



DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK) PENUGASAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING

NO. PAKET :  
NO. RUAS :  
NAMA RUAS :  
PROVINSI : JAWA TENGAH



CV. ARSITRA KONSULTAN

DIGAMBAR

DIRENCANAKAN

DIPERIKSA

JUDUL GAMBAR :

TYPIKAL POTONGAN MELINTANG

NO LEMBAR : 9


JML LEMBAR : 17

SKALA 1:100

|            |                    |
|------------|--------------------|
| NAMA RUAS  | BERUK - WONOKELING |
| NOMOR RUAS |                    |
| KECAMATAN  | JATIYOSO           |
| KABUPATEN  | KARANGANYAR        |
| TAHUN      | 2022               |


## EKSISTING

STA 0+000 S/D STA 0+800

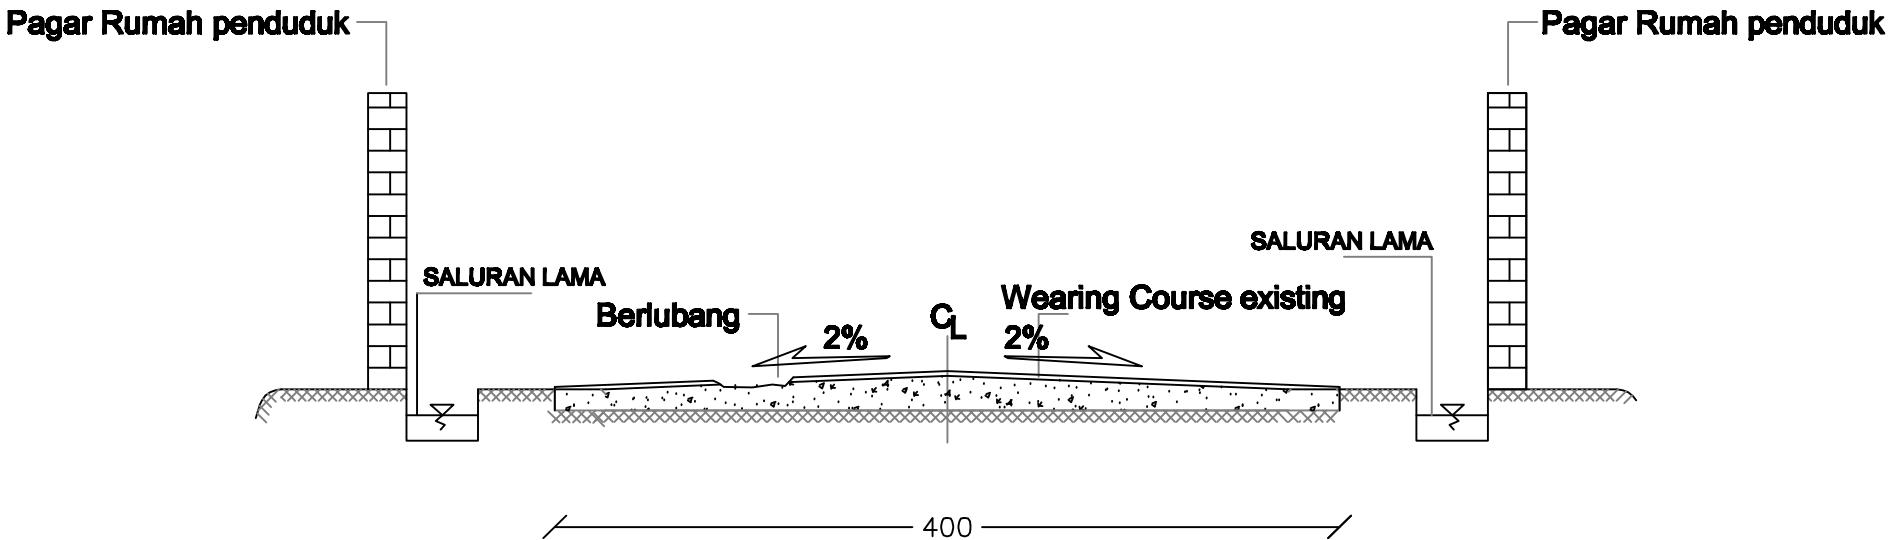


## RENCANA

STA 0+000 S/D STA 0+800

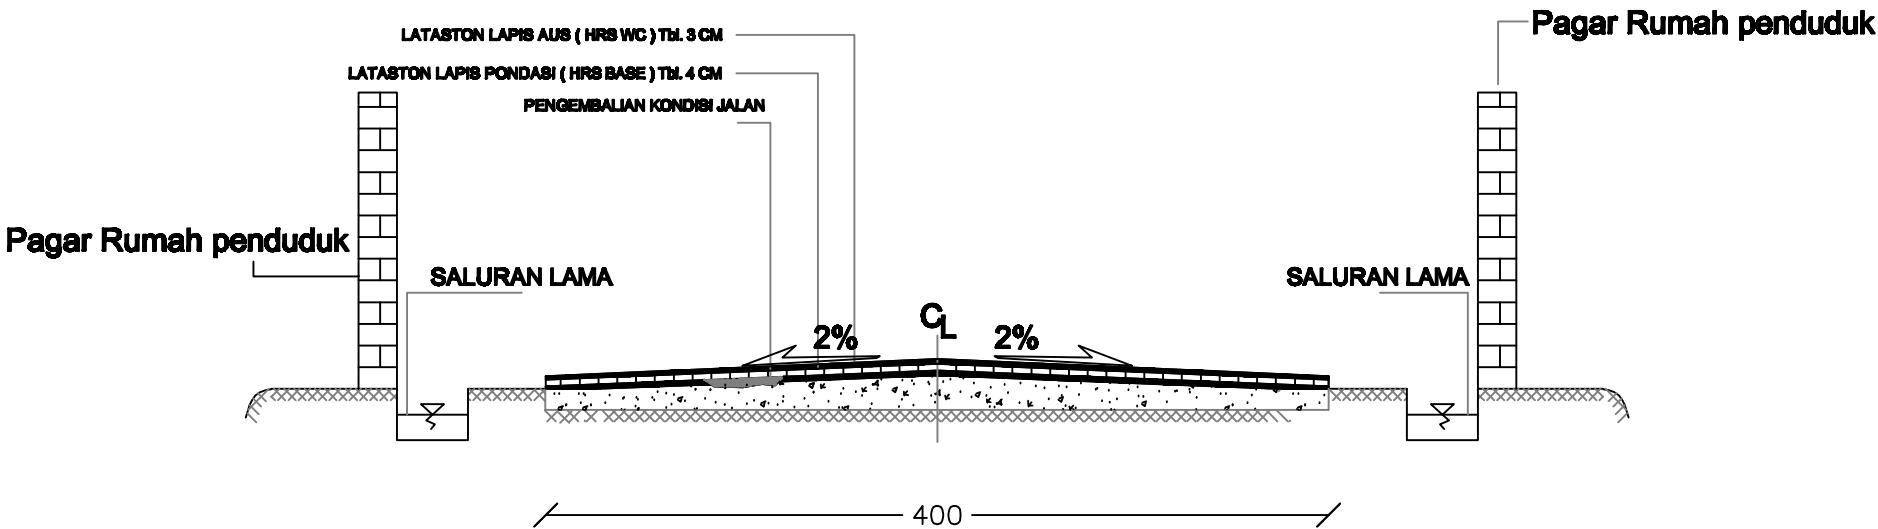


|                                                                                   |                                                                               |                                                                |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | DANA ALOKASI KHUSUS<br>(DAK) PENUGASAN<br>KABUPATEN KARANGANYAR<br>TAHUN 2022 | PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI<br>JALAN BERUK - WONOKELING | NO. PAKET :            |  | CV. ARSITRA KONSULTAN                                                               |                                                                                     |                                                                                     | JUDUL GAMBAR :             | NO LEMBAR :10   |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                | NO. RUAS :             |                                                                                     | DIGAMBAR                                                                            | DIRENCANAKAN                                                                        | DIPERIKSA                                                                           | TYPICAL POTONGAN MELINTANG | JML LEMBAR : 17 |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                | NAMA RUAS :            |                                                                                     |  |  |  |                            | SKALA 1:100     |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                | PROVINSI : JAWA TENGAH |                                                                                     | DANG TEE A. ST                                                                      | TEDY IWAN S.ST                                                                      | MASTERIO PRAHARYA, ST                                                               |                            |                 |
| NAMA RUAS                                                                         | BERUK - WONOKELING                                                            |                                                                |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                 |
| NOMOR RUAS                                                                        |                                                                               |                                                                |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                 |
| KECAMATAN                                                                         | JATTYOSO                                                                      |                                                                |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                 |
| KABUPATEN                                                                         | KARANGANYAR                                                                   |                                                                |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                 |
| TAHUN                                                                             | 2022                                                                          |                                                                |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                 |

EKSISTING  
STA 0+800 S/D STA 0+900

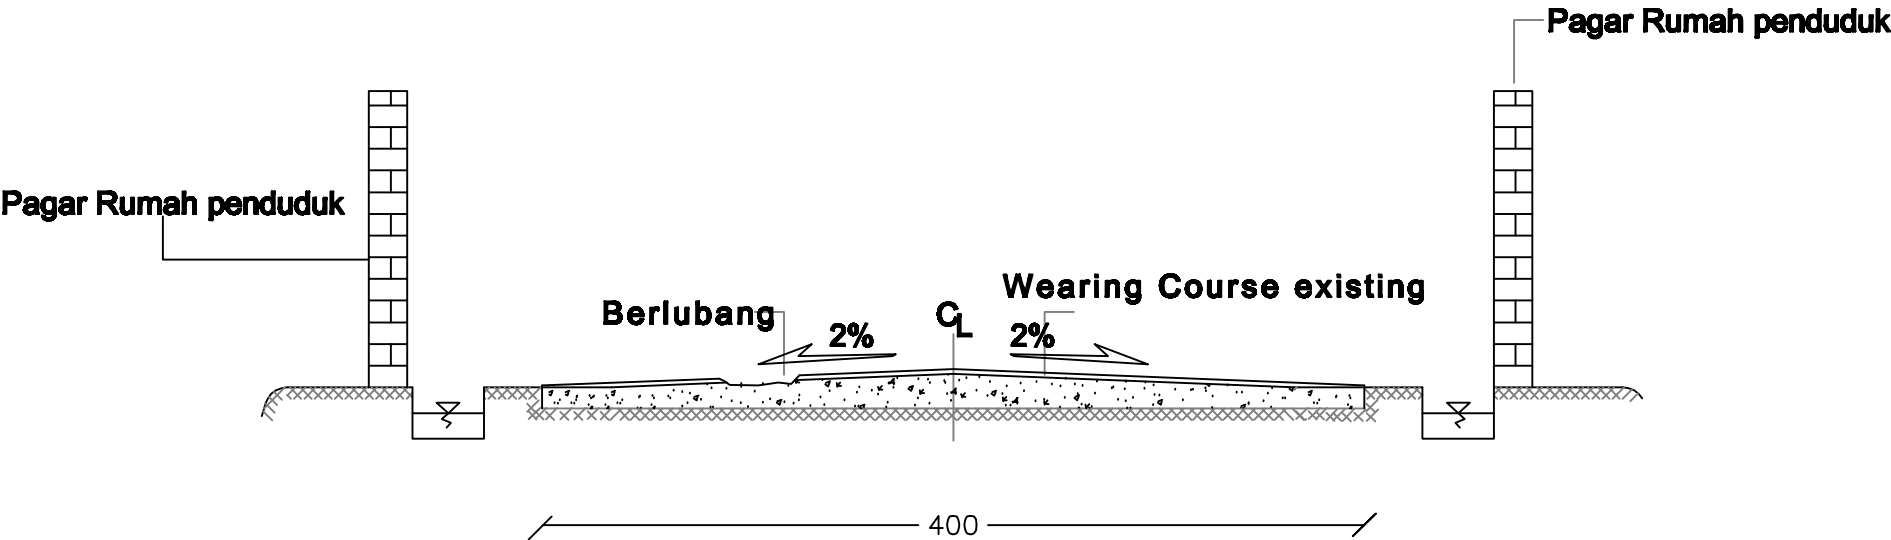

RENCANA  
STA 0+800 S/D STA 0+900

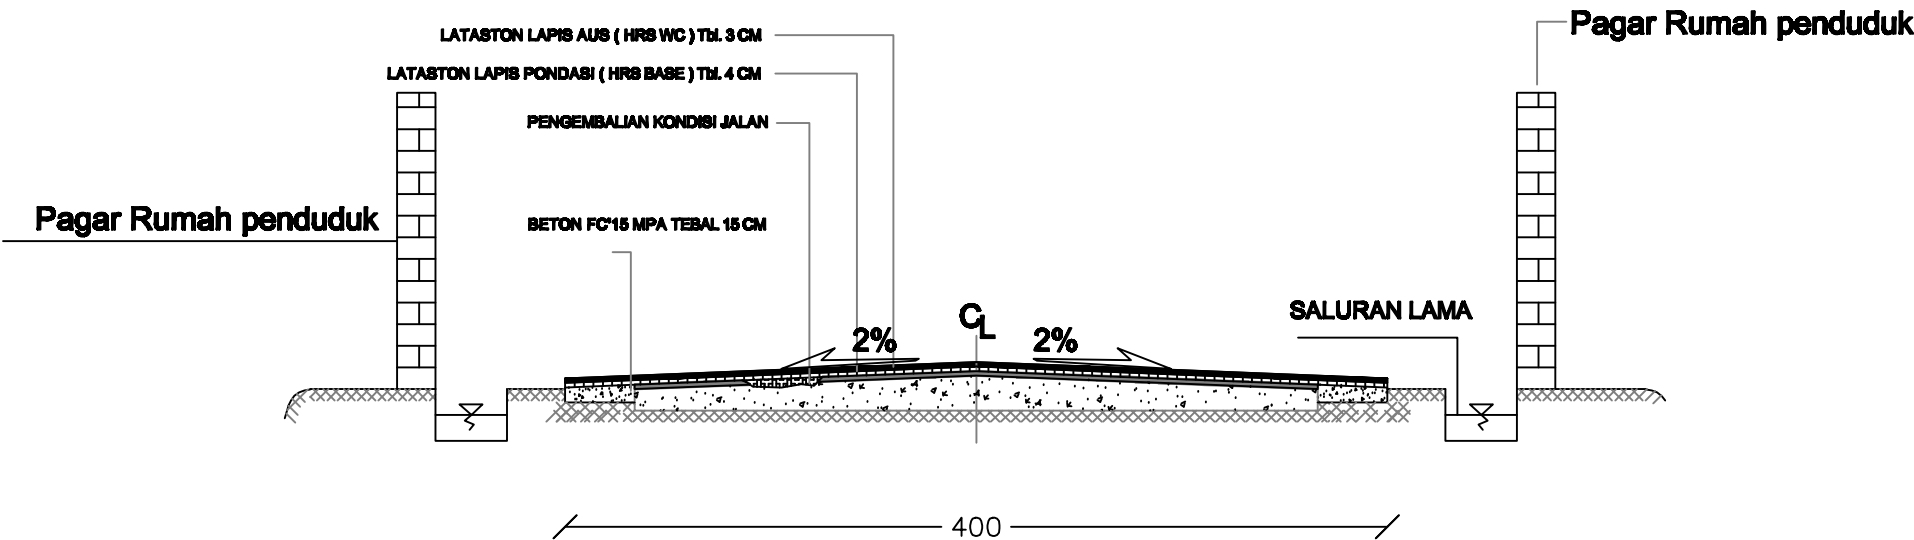



**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>NO. PAKET</b> | :             |
| <b>NO. RUAS</b>  | :             |
| <b>NAMA RUAS</b> | :             |
| <b>PROVINSI</b>  | : JAWA TENGAH |

**DIGAMBAR**

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>DIRENCANAKAN</b> |
|--|---------------------|

**DIPERIKSA**

**JUDUL GAMBAR :**

**NO LEMBAR :11**


**JML LEMBAR: 17**

**TYPIKAL POTONGAN MELINTANG**

**SKALA 1:100**


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>NAMA RUAS</b>  | <b>BERUK - WONOKELING</b> |
| <b>NOMOR RUAS</b> |                           |
| <b>KECAMATAN</b>  | <b>JATTYOSO</b>           |
| <b>KABUPATEN</b>  | <b>KARANGANYAR</b>        |
| <b>TAHUN</b>      | <b>2022</b>               |

**STA 0+900 S/D STA 0+950**

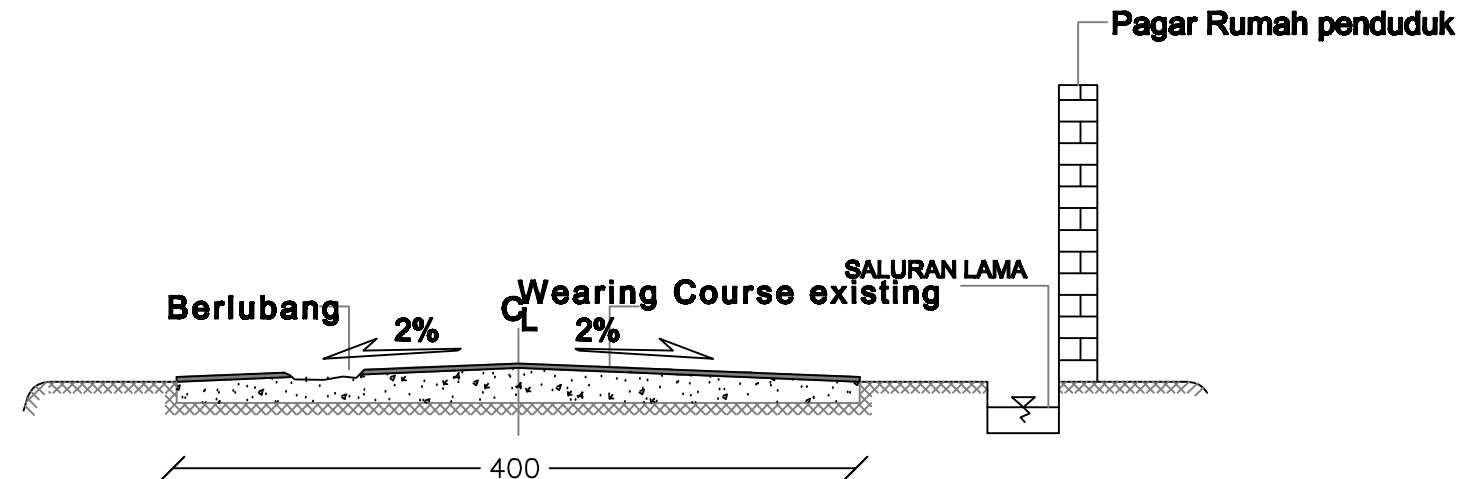

**STA 0+900 S/D STA 0+950**

**Panjang talud  $P=50$  m**

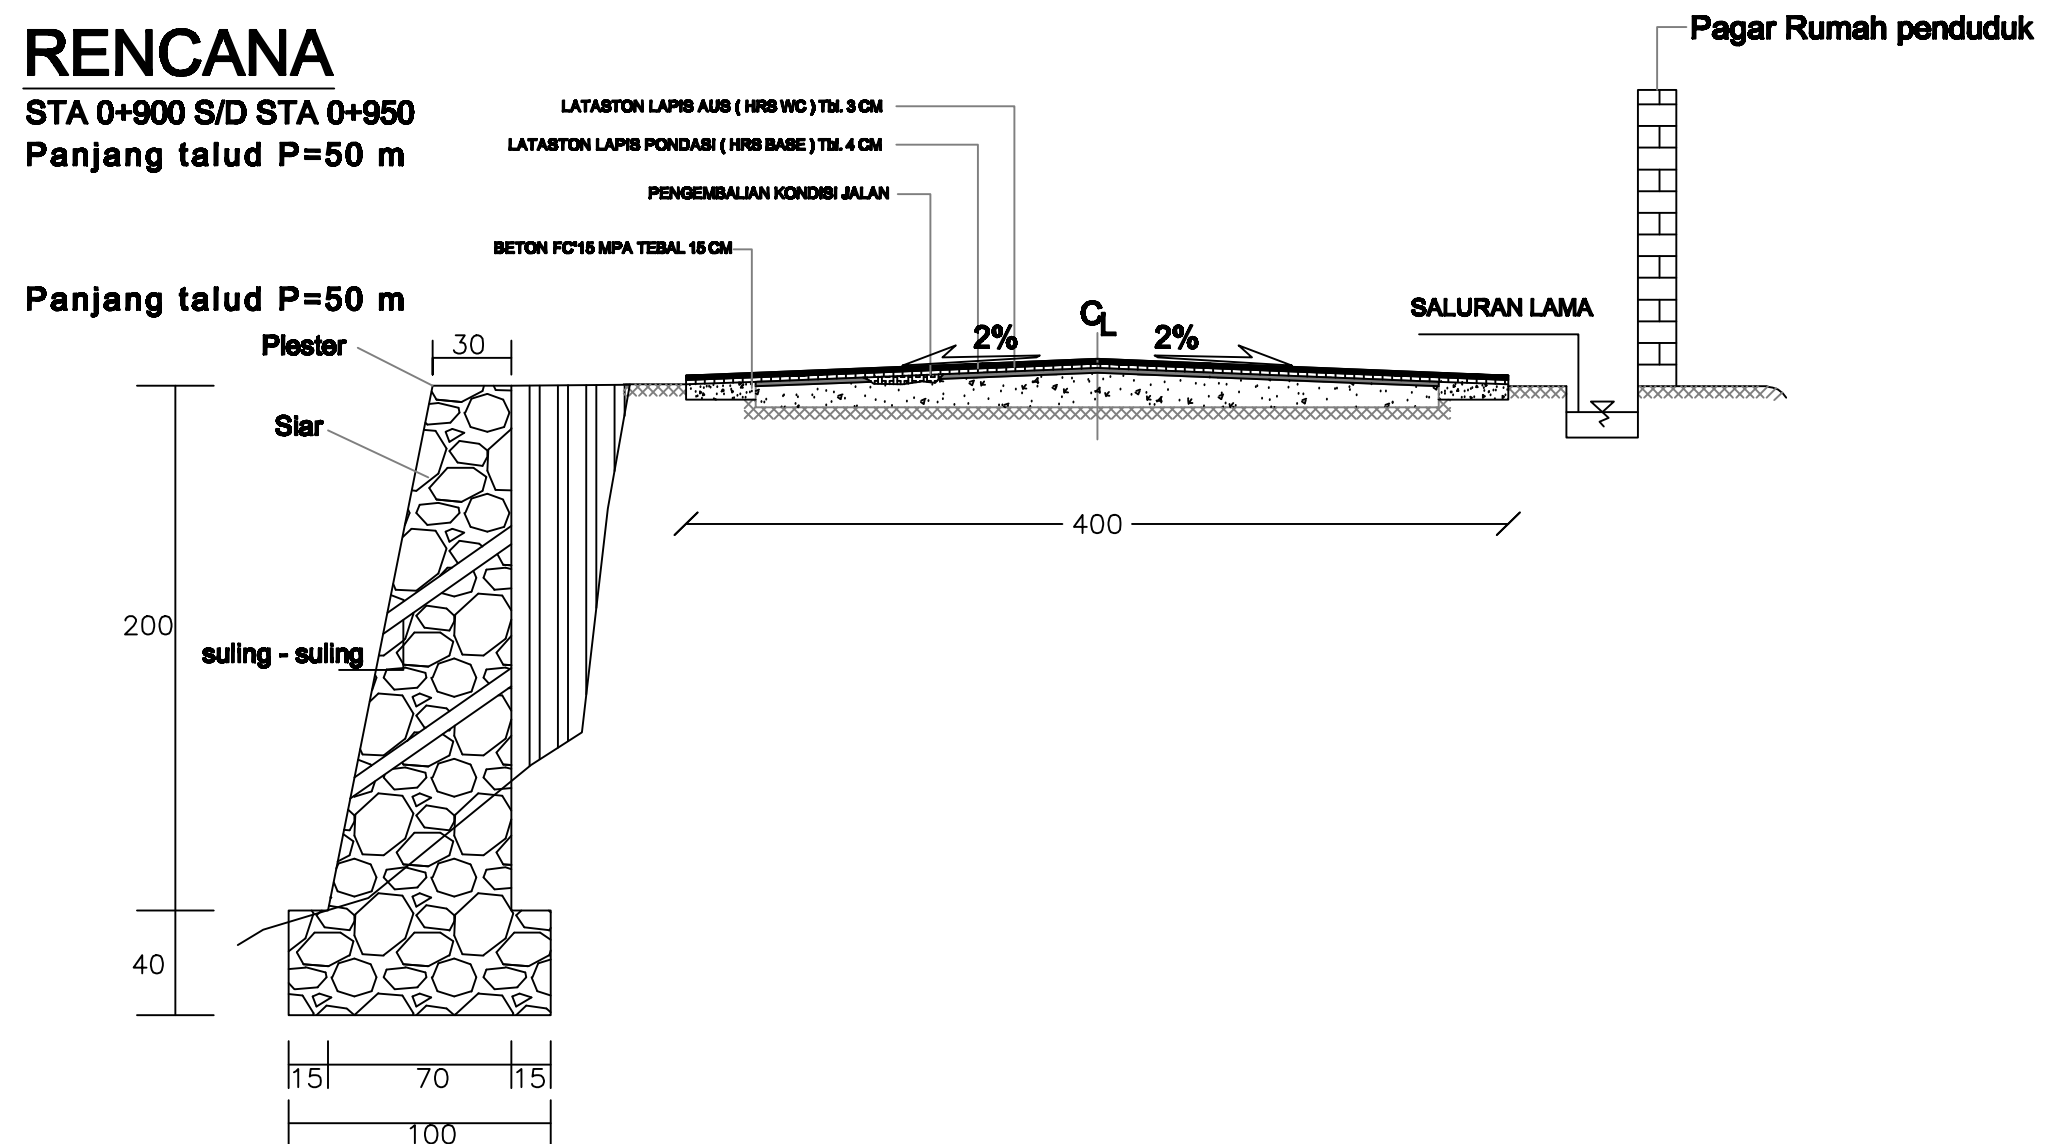



DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK) PENUGASAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING

NO. PAKET :  
NO. RUAS :  
NAMA RUAS :  
PROVINSI : JAWA TENGAH



CV. ARSITRA KONSULTAN

DIGAMBAR

DIRENCANAKAN

DIPERIKSA

JUDUL GAMBAR :

TYPIKAL POTONGAN MELINTANG

NO LEMBAR :12


JML LEMBAR :17

SKALA 1:100

|            |                    |
|------------|--------------------|
| NAMA RUAS  | BERUK - WONOKELING |
| NOMOR RUAS |                    |
| KECAMATAN  | JATIYOSO           |
| KABUPATEN  | KARANGANYAR        |
| TAHUN      | 2022               |


## EKSISTING

STA 0+950 S/D STA 1+400

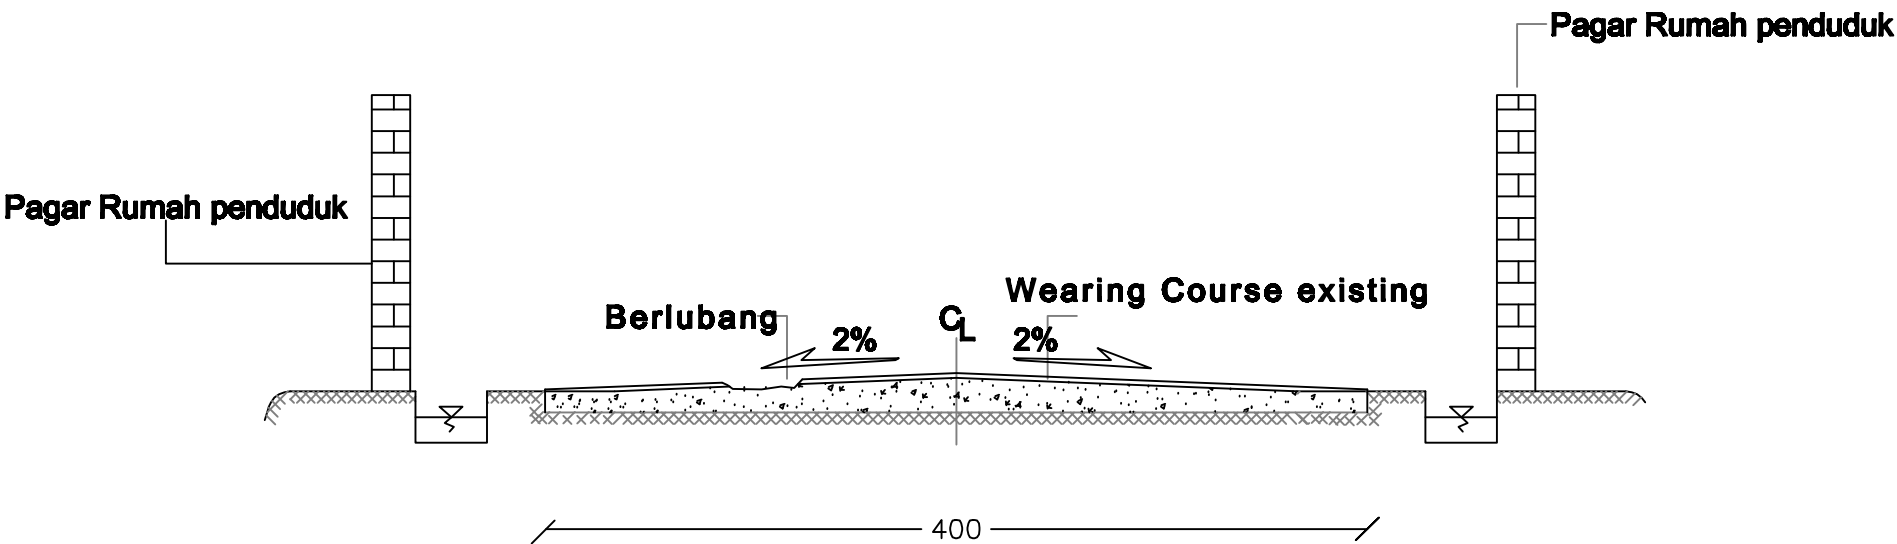

## RENCANA


STA 0+950 S/D STA 1+400

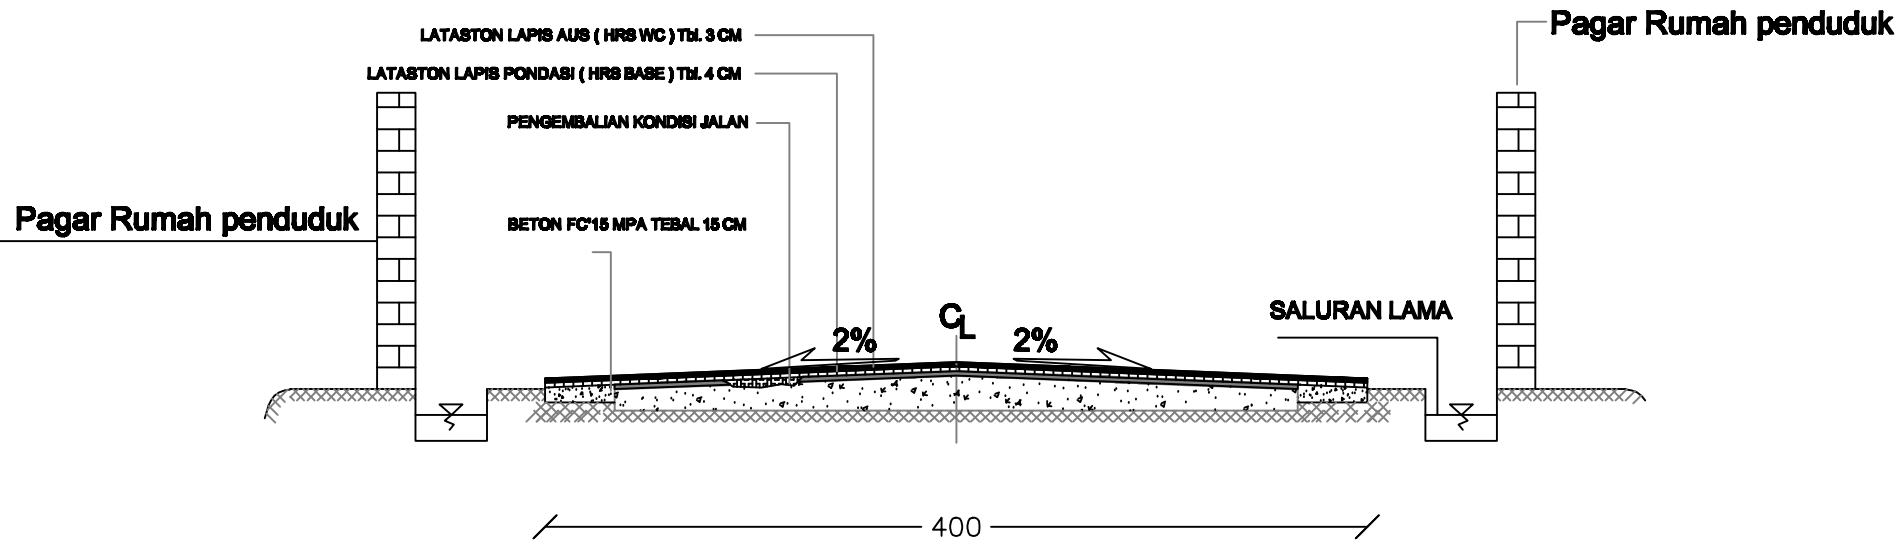

|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                |  |                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| <div></div> <div>DANA ALOKASI KHUSUS<br/>(DAK) PENUGASAN<br/>KABUPATEN KARANGANYAR<br/>TAHUN 2022</div> |                    | PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI<br>JALAN BERUK - WONOKELING |  | NO. PAKET :            |  | CV. ARSITRA KONSULTAN                                                               |                                                                                     |                                                                                     | JUDUL GAMBAR :                                                                      |                            | NO LEMBAR :13  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                |  | NO. RUAS :             |  |  | DIGAMBAR                                                                            | DIRENCANAKAN                                                                        | DIPERIKSA                                                                           | TYPICAL POTONGAN MELINTANG | JML LEMBAR :17 |  |
|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                |  | NAMA RUAS :            |  |                                                                                     |  |  |  |                            | SKALA 1:100    |  |
|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                |  | PROVINSI : JAWA TENGAH |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |
| NAMA RUAS                                                                                                                                                                                | BERUK - WONOKELING |                                                                |  |                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |
| NOMOR RUAS                                                                                                                                                                               |                    |                                                                |  |                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |
| KECAMATAN                                                                                                                                                                                | JATTYOSO           |                                                                |  |                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |
| KABUPATEN                                                                                                                                                                                | KARANGANYAR        |                                                                |  |                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |
| TAHUN                                                                                                                                                                                    | 2022               |                                                                |  |                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |  |


EKSISTING

STA 1+ 400 S/D STA 2+000

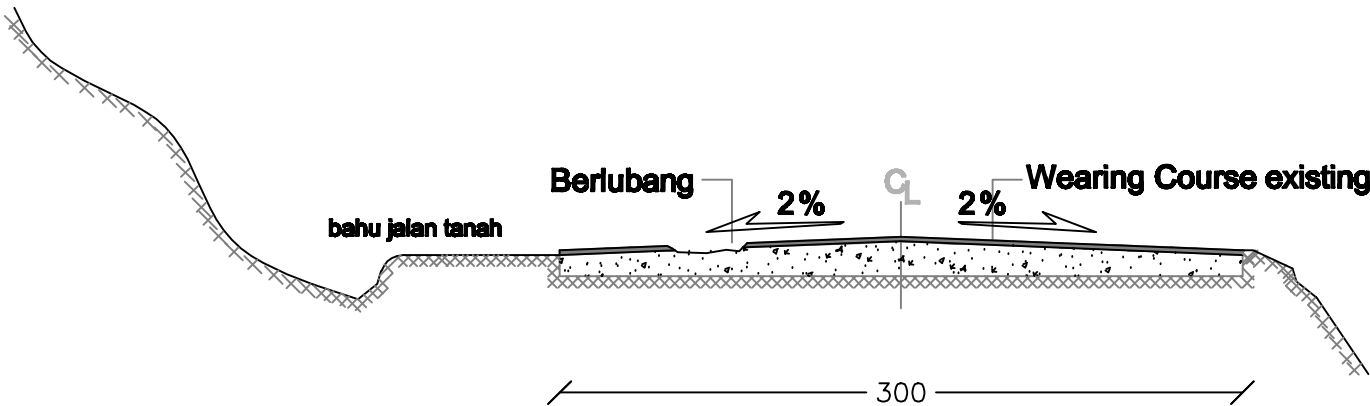

RENCANA


STA 1+ 400 S/D STA 2+000

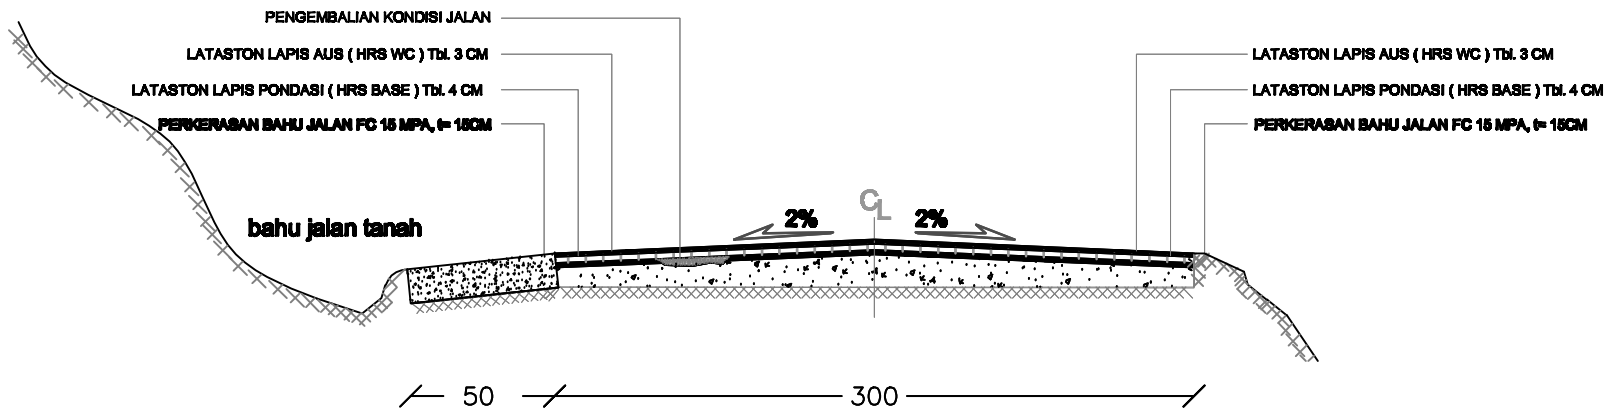

|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                |                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <div></div> <div>DANA ALOKASI KHUSUS<br/>(DAK) PENUGASAN<br/>KABUPATEN KARANGANYAR<br/>TAHUN 2022</div> |                    | PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI<br>JALAN BERUK - WONOKELING | NO. PAKET :            | <div></div> | CV. ARSITRA KONSULTAN                                                                          |                                                                                                |                                                                                                | JUDUL GAMBAR :             | NO LEMBAR :14  |
|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                | NO. RUAS :             |                                                                                                | DIGAMBAR                                                                                       | DIRENCANAKAN                                                                                   | DIPERIKSA                                                                                      | TYPICAL POTONGAN MELINTANG | JML LEMBAR :17 |
|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                | NAMA RUAS :            |                                                                                                | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                            | SKALA 1:100    |
|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                | PROVINSI : JAWA TENGAH |                                                                                                | DANG TET A. ST                                                                                 | TEDY IWAN S.ST                                                                                 | MASTERIO PRAHARYA, ST                                                                          |                            |                |
| NAMA RUAS                                                                                                                                                                                | BERUK - WONOKELING |                                                                |                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                            |                |
| NOMOR RUAS                                                                                                                                                                               |                    |                                                                |                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                            |                |
| KECAMATAN                                                                                                                                                                                | JATTIYOSO          |                                                                |                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                            |                |
| KABUPATEN                                                                                                                                                                                | KARANGANYAR        |                                                                |                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                            |                |
| TAHUN                                                                                                                                                                                    | 2022               |                                                                |                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                            |                |


EKSISTING

STA 2+ 000 S/D STA 2+200  
STA 2+400 S/D STA 2+600

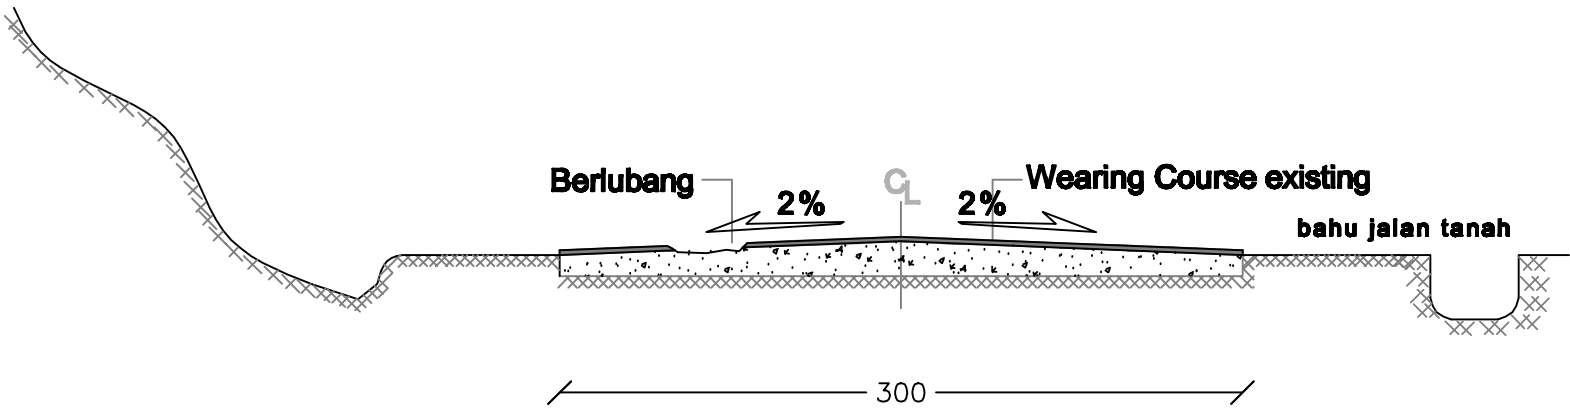

RENCANA


STA 2+ 000 S/D STA 2+200  
STA 2+400 S/D STA 2+600

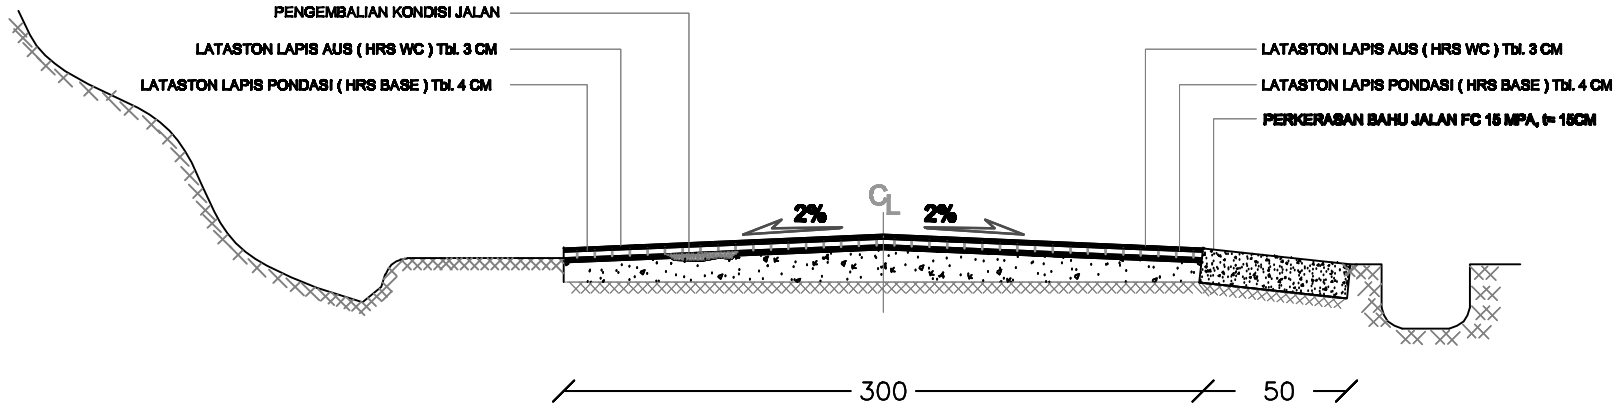

|                                                                                                                                                                               |                    |                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|  <div>DANA ALOKASI KHUSUS<br/>(DAK) PENUGASAN<br/>KABUPATEN KARANGANYAR<br/>TAHUN 2022</div> |                    | PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI<br>JALAN BERUK - WONOKELING | NO. PAKET :<br>NO. RUAS :<br>NAMA RUAS :<br>PROVINSI : JAWA TENGAH                  |  | CV. ARSITRA KONSULTAN                                                               |                                                                                     |                            | JUDUL GAMBAR : | NO LEMBAR :15 |
|                                                                                                                                                                               |                    |                                                                | DIGAMBAR                                                                            |                                                                                     | DIRENCANAKAN                                                                        | DIPERIKSA                                                                           | TYPICAL POTONGAN MELINTANG | JML LEMBAR :17 |               |
|                                                                                                                                                                               |                    |                                                                |  |                                                                                     |  |  |                            | SKALA 1:100    |               |
|                                                                                                                                                                               |                    |                                                                | DANO IRFAN S.T                                                                      |                                                                                     | TEDY IWAN S.ST                                                                      | MASTERIO PRAHAERYA, ST                                                              |                            |                |               |
| NAMA RUAS                                                                                                                                                                     | BERUK - WONOKELING |                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |               |
| NOMOR RUAS                                                                                                                                                                    |                    |                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |               |
| KECAMATAN                                                                                                                                                                     | JATTYOSO           |                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |               |
| KABUPATEN                                                                                                                                                                     | KARANGANYAR        |                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |               |
| TAHUN                                                                                                                                                                         | 2022               |                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                |               |


EKSISTING

STA 2+200 S/D STA 4+100

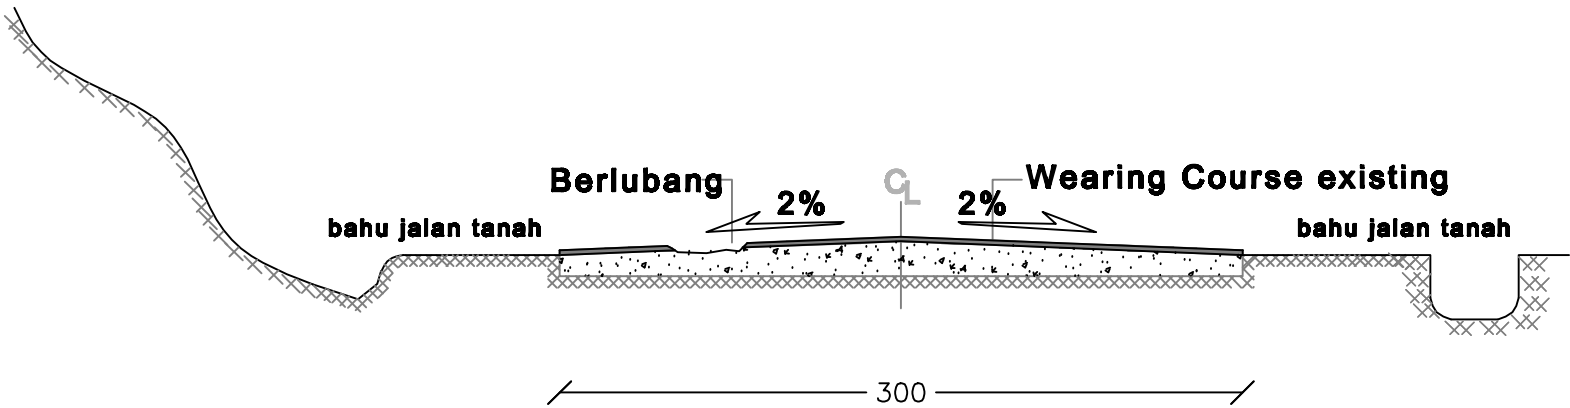

RENCANA


STA 2+200 S/D STA 4+100

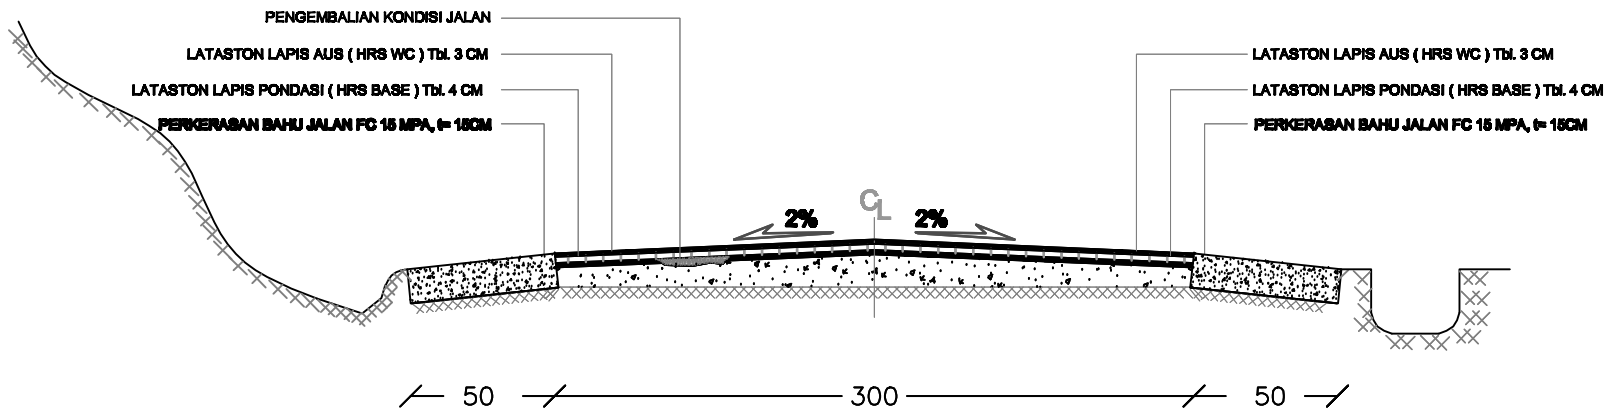

|                                                                                                                                                                              |                           |                                                                        |                               |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <br><b>DANA ALOKASI KHUSUS<br/>(DAK) PENUGASAN<br/>KABUPATEN KARANGANYAR<br/>TAHUN 2022</b> |                           | <b>PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI<br/>JALAN BERUK - WONOKELING</b> | <b>NO. PAKET : </b>           |  |  | <b>CV. ARSITRA KONSULTAN</b>                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                     | <b>JUDUL GAMBAR :</b>             | <b>NO LEMBAR :16</b>  |
|                                                                                                                                                                              |                           |                                                                        | <b>NO. RUAS : </b>            |  |                                                                                     | <b>DIGAMBAR</b>                                                                                              | <b>DIRENCANAKAN</b>                                                                                          | <b>DIPERIKSA</b>                                                                                                    | <b>TYPICAL POTONGAN MELINTANG</b> | <b>JML LEMBAR :17</b> |
|                                                                                                                                                                              |                           |                                                                        | <b>NAMA RUAS : </b>           |  |                                                                                     | <br><b>DANG TEE A. ST</b> | <br><b>TEDY IWAN S.ST</b> | <br><b>MASTERIO PRAHARYA, ST</b> |                                   | <b>SKALA 1:100</b>    |
|                                                                                                                                                                              |                           |                                                                        | <b>PROVINSI : JAWA TENGAH</b> |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |
| <b>NAMA RUAS</b>                                                                                                                                                             | <b>BERUK - WONOKELING</b> |                                                                        |                               |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |
| <b>NOMOR RUAS</b>                                                                                                                                                            |                           |                                                                        |                               |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |
| <b>KECAMATAN</b>                                                                                                                                                             | <b>JATIYOSO</b>           |                                                                        |                               |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |
| <b>KABUPATEN</b>                                                                                                                                                             | <b>KARANGANYAR</b>        |                                                                        |                               |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |
| <b>TAHUN</b>                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>               |                                                                        |                               |  |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                   |                       |

# EKSISTING


STA 3+100 S/D STA 3+482

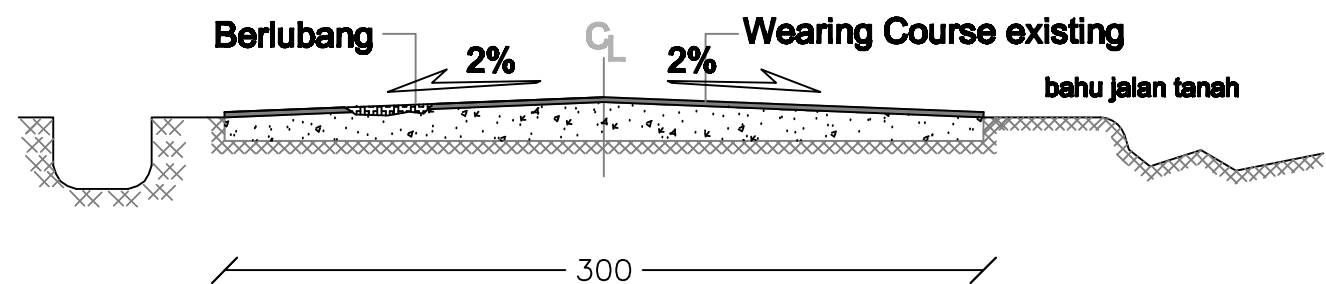

# RENCANA

STA 3+100 S/D STA 3+250

Panjang Talud = 150M

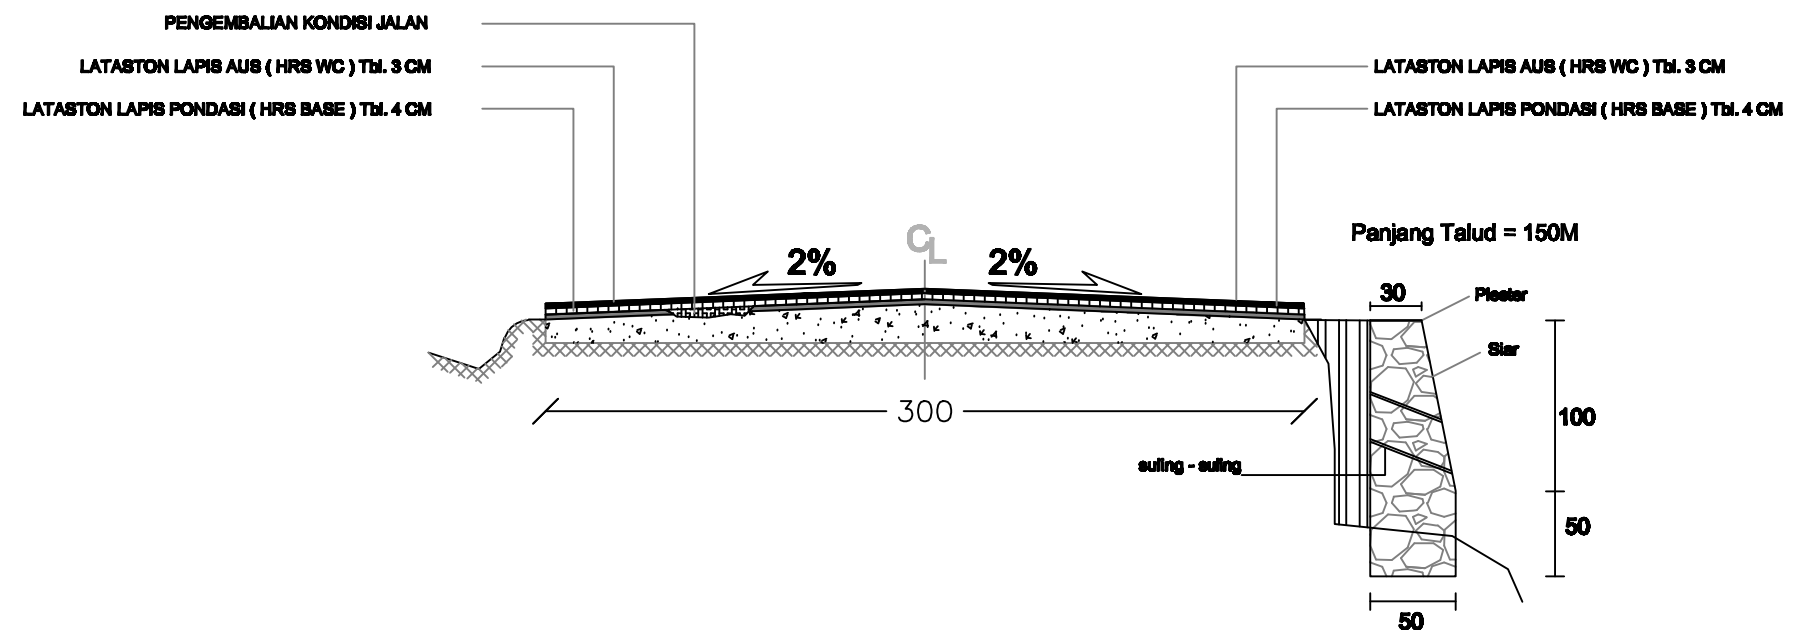



DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK) PENUGASAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022

PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI  
JALAN BERUK - WONOKELING

NO. PAKET :  
NO. RUAS :  
NAMA RUAS :  
PROVINSI : JAWA TENGAH



CV. ARSITRA KONSULTAN

DIGAMBAR

DIRENCANAKAN

DIPERIKSA

DANG TET A. ST

TEDY IWAN S.ST

MASTERO PRAHARYA, ST

JUDUL GAMBAR :

TYPIKAL POTONGAN MELINTANG

NO LEMBAR :17

JML LEMBAR : 17

SKALA 1:100

|            |                    |
|------------|--------------------|
| NAMA RUAS  | BERUK - WONOKELING |
| NOMOR RUAS |                    |
| KECAMATAN  | JATTIYOSO          |
| KABUPATEN  | KARANGANYAR        |
| TAHUN      | 2022               |

GARIS PEMISAH JALUR

12

|             |             |
|-------------|-------------|
| KECEPATAN   | a = 5 meter |
| < 60 KM/JAM | b = 3 meter |



DETAIL PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK

**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**PEMELIHARAAN BERKALA/ REHABILITASI JALAN BERUK - WONOKELING ( DAK**  
**REGULER )**

Nomor : 027/834/UKPBJ/IV/2022

Pada hari ini, 22 April 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 2651141

Nama Tender : Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan Beruk - Wonokeling ( DAK Reguler )

Nilai Total HPS : Rp. 3.565.694.968,97

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 68 Peserta yang mendaftar terdapat 8 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

| No. | Nama Peserta                 | Nilai Penawaran      |
|-----|------------------------------|----------------------|
| 1   | LEGRA SEJAHTERA. CV          | Rp. 2.852.556.011,66 |
| 2   | CV. INDAH HARUM CONST        | Rp. 2.958.041.212,79 |
| 3   | CV. PUTRA KALINGGA           | Rp. 2.972.448.812,74 |
| 4   | PT. Manira Arta Rama Mandiri | Rp. 3.199.771.306,63 |
| 5   | CV PERWITA UTAMI             | Rp. 3.308.948.719,95 |
| 6   | CV.TUMPU HARAPAN             | Rp. 3.475.856.053,89 |
| 7   | CV. AGUNG MULIA KONSTRUKSI   | Rp. 3.493.860.852,58 |
| 8   | BEJO LUMINTU, CV             | Rp. 3.525.956.603,77 |
| 9   | CV.NAGA SAKTI                |                      |
| 10  | PT. PONCOREDJO               |                      |
| 11  | CV. SURYA GRAHA UTAMA        |                      |
| 12  | CV. JAYA TEKNIK              |                      |
| 13  | CV. ADINATA KENCANA ABADI    |                      |
| 14  | CV. SATRIA UTAMA             |                      |
| 15  | CV KARANGJATI                |                      |
| 16  | PT HEFA SARANA KONTRAKTOR    |                      |

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 17 | CV ZAFRAN UTOMO KONSTRUKSI  |  |
| 18 | CV.MITRA KONSTRUKSI         |  |
| 19 | cv.rizki agung              |  |
| 20 | PT. TELADAN BERKAH ABADI    |  |
| 21 | CV. DEWANTA JAYA            |  |
| 22 | C.V.SOSRO KARYA             |  |
| 23 | CV. WIRA NADI SUACCHA       |  |
| 24 | CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR   |  |
| 25 | CV.SANJAYA                  |  |
| 26 | KARYA SAKTI. CV             |  |
| 27 | PERISAI BANGSA. CV          |  |
| 28 | CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI |  |
| 29 | CV. ARSA MAKMUR             |  |
| 30 | CV. MANDIRI                 |  |
| 31 | CV. GUNUNG JATI             |  |
| 32 | Wijaya Kusuma               |  |
| 33 | SUKSES KONSTRUKSI           |  |
| 34 | CV. MAKMUR JAYA             |  |
| 35 | CV. TUNJUNG JAYA            |  |
| 36 | karya muda                  |  |
| 37 | suryo adhi utomo            |  |
| 38 | CV RAGIL PAMUNGKAS          |  |
| 39 | CV. DUTA KALINGGA           |  |
| 40 | CV. SINAR KARYA PERKASA     |  |
| 41 | CV. FAJAR INDAH             |  |
| 42 | CV.SENDANG JAYA             |  |
| 43 | CV. REJEKINING ABADI        |  |
| 44 | CV. GARUDA                  |  |
| 45 | HKM                         |  |
| 46 | CITRA NUR MANDIRI           |  |
| 47 | CV CANDRA KIRANA            |  |

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 48 | CV. SUSANTO PUTRA          |  |
| 49 | CV.ALINTA SURYA BANTEN     |  |
| 50 | cv. Naafi Alam Sentosa     |  |
| 51 | CV. ANDARU KONSTRUKSINDO   |  |
| 52 | CV.CENTRAL KARYA           |  |
| 53 | sami asih                  |  |
| 54 | CV. MERBABU ASSRI          |  |
| 55 | CV. GANGSAR PADOS REJEKI   |  |
| 56 | cv mitra mandiri sejahtera |  |
| 57 | SURYA MANDALA KRIDA        |  |
| 58 | PT. SEMARANG MULTI CONS    |  |
| 59 | PT. JAYA SEMPURNA SAKTI    |  |
| 60 | CV CATUR MANUNGGAL         |  |
| 61 | BINTANG BERSINAR           |  |
| 62 | CV.BATU INTAN              |  |
| 63 | PT. BERKAH SOLO BERDIKARI  |  |
| 64 | CV JAYA SEMPURNA ABADI     |  |
| 65 | CV Jasem Makmur Abadi      |  |
| 66 | VINO PERKASA               |  |
| 67 | CV. JACK KINDO             |  |
| 68 | CV. KARYA UTAMA            |  |

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

| No. | Nama Peserta          | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------------|------------|
| 1   | CV. PUTRA KALINGGA    | LULUS          |            |
| 2   | CV. INDAH HARUM CONST | LULUS          |            |
| 3   | LEGRA SEJAHTERA. CV   | LULUS          |            |

2. Evaluasi Administrasi

| No. | Nama Peserta                 | Hasil Evaluasi | Keterangan                          |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1   | PT. Manira Arta Rama Mandiri | TIDAK LULUS    | tidak dievaluasi karena sudah ada 3 |

|   |                            |             |                                                                                                                      |
|---|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |             | penawar terendah yang lulus evaluasi teknis dan harga dan pembuktian kualifikasi                                     |
| 2 | CV PERWITA UTAMI           | TIDAK LULUS | tidak dievaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah yang lulus evaluasi teknis dan harga dan pembuktian kualifikasi |
| 3 | CV. PUTRA KALINGGA         | LULUS       |                                                                                                                      |
| 4 | CV.TUMPU HARAPAN           | TIDAK LULUS | tidak dievaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah yang lulus evaluasi teknis dan harga dan pembuktian kualifikasi |
| 5 | CV. INDAH HARUM CONST      | LULUS       |                                                                                                                      |
| 6 | BEJO LUMINTU, CV           | TIDAK LULUS | tidak dievaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah yang lulus evaluasi teknis dan harga dan pembuktian kualifikasi |
| 7 | LEGRA SEJAHTERA. CV        | LULUS       |                                                                                                                      |
| 8 | CV. AGUNG MULIA KONSTRUKSI | TIDAK LULUS | tidak dievaluasi karena sudah ada 3 penawar terendah yang lulus evaluasi teknis dan harga dan pembuktian kualifikasi |

### 3. Evaluasi Teknis

| No. | Nama Peserta          | Hasil Evaluasi | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------------|------------|
| 1   | CV. PUTRA KALINGGA    | LULUS          |            |
| 2   | CV. INDAH HARUM CONST | LULUS          |            |
| 3   | LEGRA SEJAHTERA. CV   | LULUS          |            |

### 4. Evaluasi Harga/Biaya

| No. | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran<br>Terkoreksi | Hasil<br>Evaluasi | Keterangan |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------|
|     |              |           |                         |                   |            |

|   |                          |                      |                      |       |  |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------|--|
| 1 | CV. PUTRA KALINGGA       | Rp. 2.972.448.812,74 | Rp. 2.972.448.812,74 | LULUS |  |
| 2 | CV. INDAH HARUM<br>CONST | Rp. 2.958.041.212,79 | Rp. 2.958.041.212,79 | LULUS |  |
| 3 | LEGRA SEJAHTERA.<br>CV   | Rp. 2.852.556.011,66 | Rp. 2.852.556.011,66 | LULUS |  |

5. Pembuktian Kualifikasi

| No. | Nama Peserta          | Hasil Pembuktian | Keterangan |
|-----|-----------------------|------------------|------------|
| 1   | CV. PUTRA KALINGGA    | LULUS            |            |
| 2   | CV. INDAH HARUM CONST | LULUS            |            |
| 3   | LEGRA SEJAHTERA. CV   | LULUS            |            |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

ttd,

POKJA PEMILIHAN KABUPATEN KARANGANYAR
